

Lietuvos konkurencinio pranašumo analizė gamybos įmonių veiklos pradžiai


08.05 – 08.19

III. Sukurtas „Gamybos medis“ pagal 1 gairės
informaciją

Ugnė Kerdokaitė ir Karolis Navickas

Procedūrų sąrašas

Gamybinis projektas plyname lauke

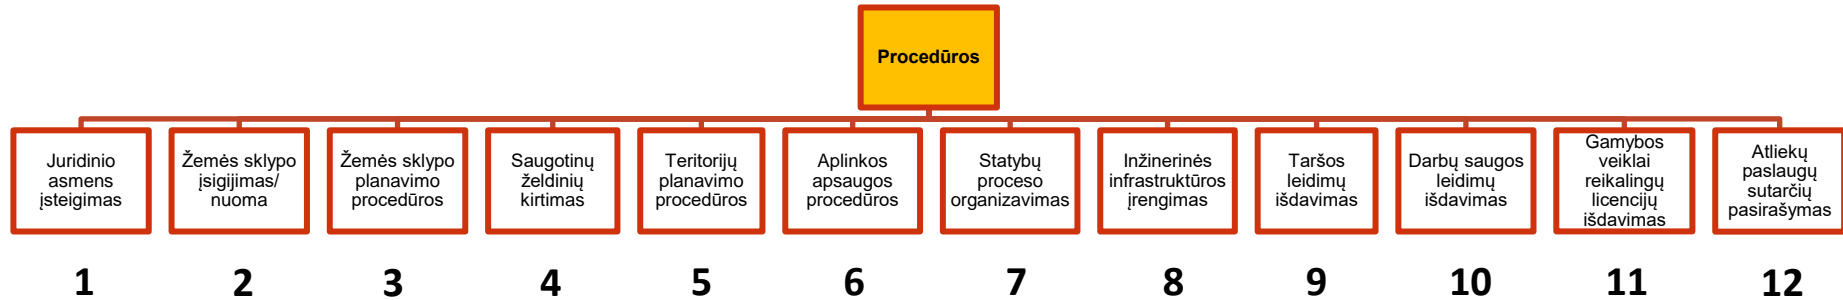

Metodologija

- Neįtraukiamas laikas, skirtas viešiesiems konkursams
- Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia projektus (pvz. statinio techninio projekto parengimas)
- Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami statybos/rekonstrukcijos darbai
- Vertinamas idealus variantas, kuomet nereikalaujama papildyti informacijos paraiškose ar pateikti papildomų dokumentų
- Neanalizuojamos konkrečios veiklos reikalingos licencijos (tai priklauso nuo konkrečios įmonės vykdomos veiklos) – **III gairės 2 dalies rezultatas**
- Skaičiuojant dokumentų skaičių įtraukiamas ir sutarčių pasirašymas, ir dokumentų pateikimas institucijoms
- Jei institucija / įstaiga priklauso dviem ar daugiau procesams, tuomet skaičiuojant institucijų / įstaigų skaičių atsižvelgiama į tai kiek kartų tenka bendrauti su institucija / įstaiga
- Skaičiuojant unikalių institucijų ir įstaigų skaičių, neįtraukiami privatūs subjektai ir institucijų ar įstaigų kontroliuojami subjektai (pvz. Žemės gelmių registras ir Lietuvos geologijos tarnyba skaičiuojami kaip viena įstaiga – Lietuvos geologijos tarnyba)
- Skaičiuojant darbo dienas remiamasi šia metodika: 7 k. d. sudaro 5 d. d., o per mėnesį turime 4 savaites ir 30 k. d., kurias sudaro 20 d. d.



Paaiškinimai



1 d.d

Procedūros trukmė



Dokumentų skaičius



Institucijų / įstaigų skaičius

Juridinio asmens (JA) pavadinimo
rezervacija Juridinių asmenų
registre (JAR)

Procedūros




1

Juridinio asmens įsteigimas



1. Juridinio asmens įsteigimas

UAB

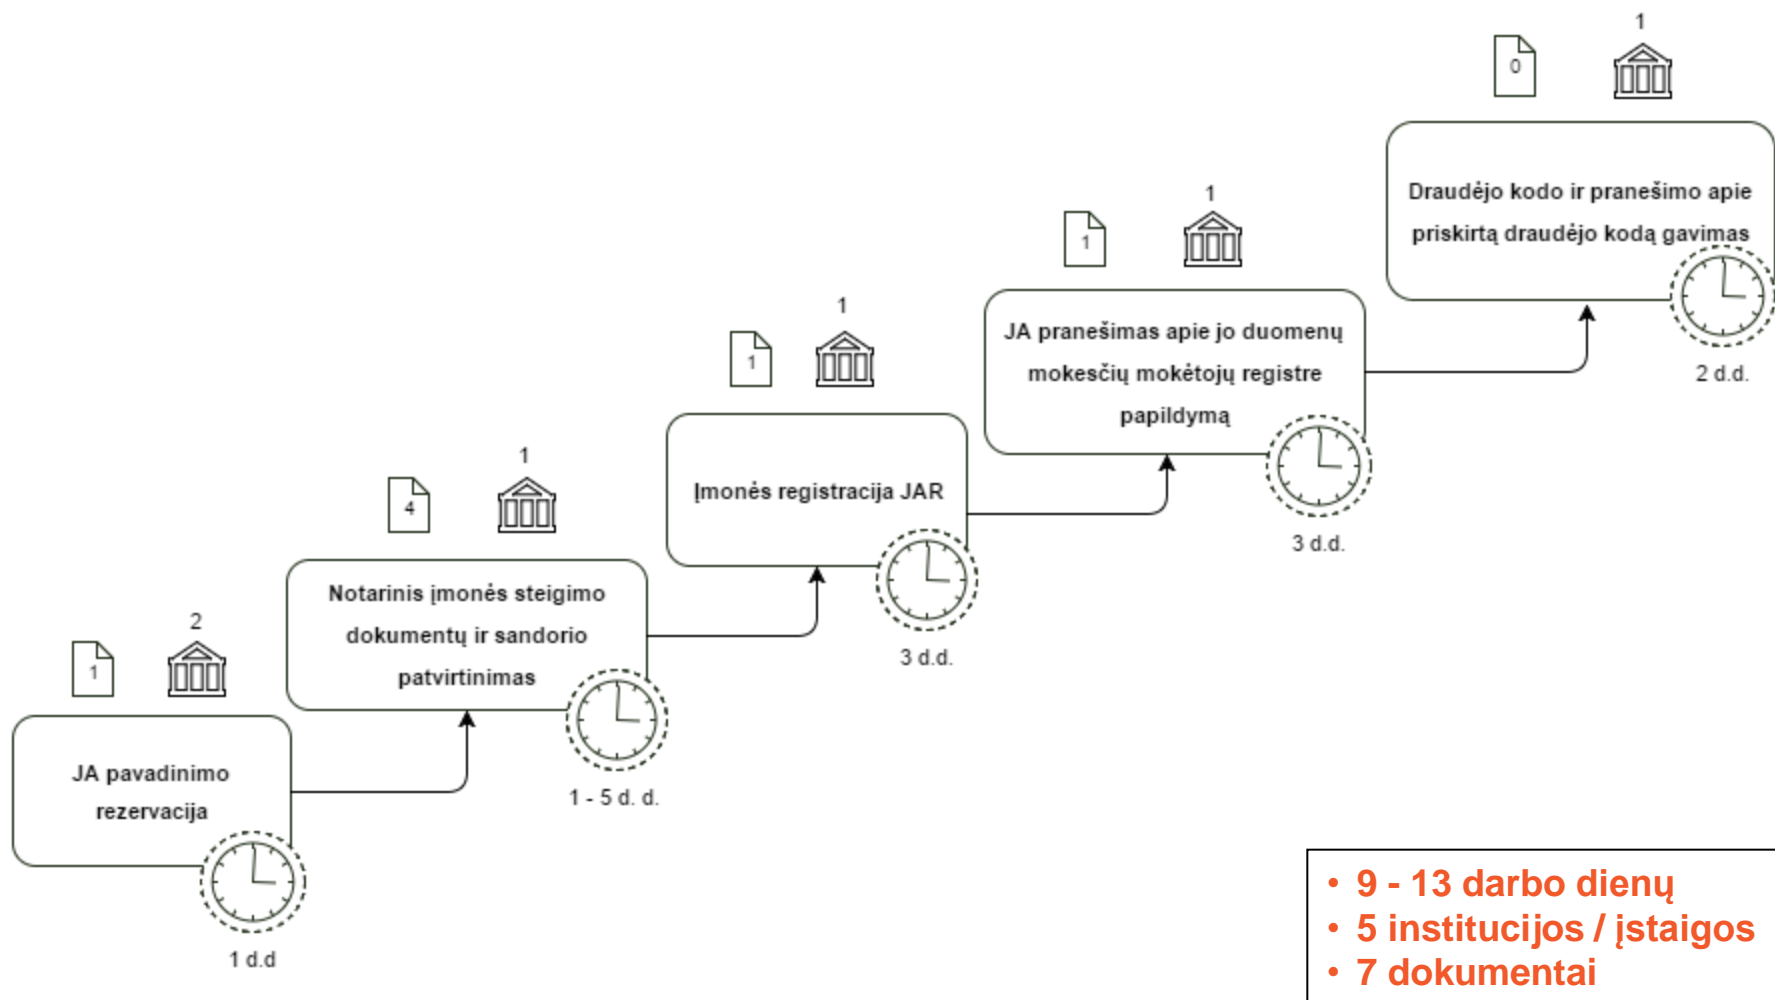


2

Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma



2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma


1. Privati ir valstybinė žemė

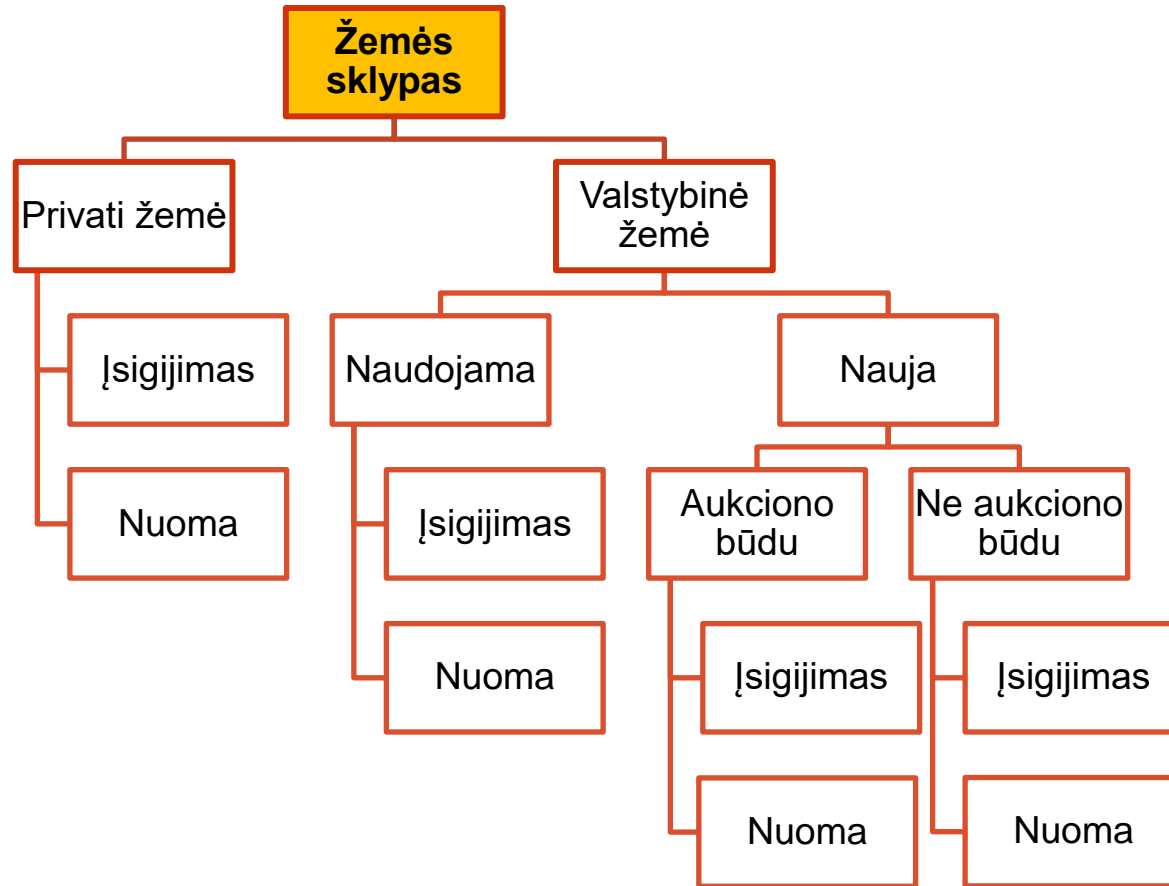

2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma

2. Privati žemė

2.2.1. Privačios kitos paskirties žemės įsigijimas

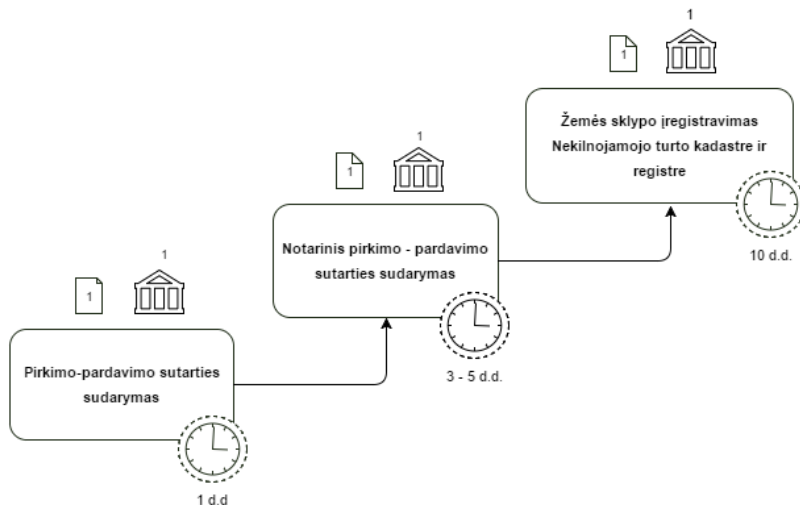

- 14 - 16 darbo dienų
- 3 institucijos / įstaigos
- 3 dokumentai

2.2.2. Privačios kitos paskirties žemės nuoma




- 1 darbo diena
- 1 institucija / įstaiga
- 1 dokumentas




2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma

3. Naudojamos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas

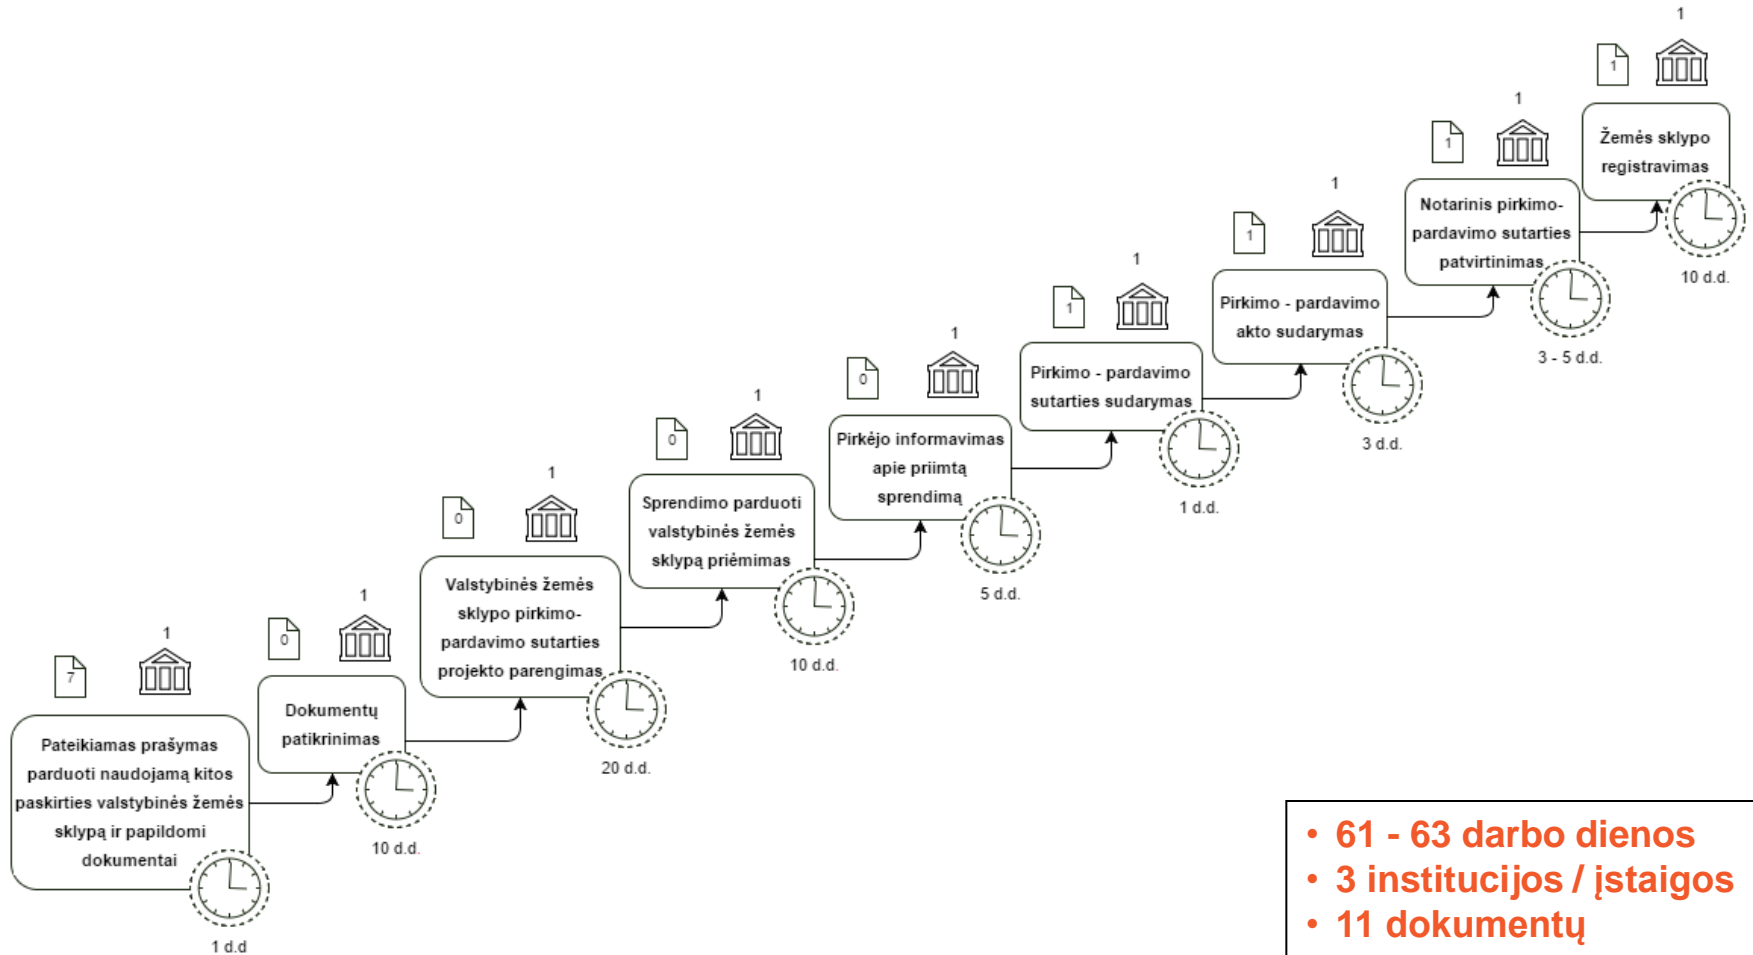

2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma

4. Naudojamos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma

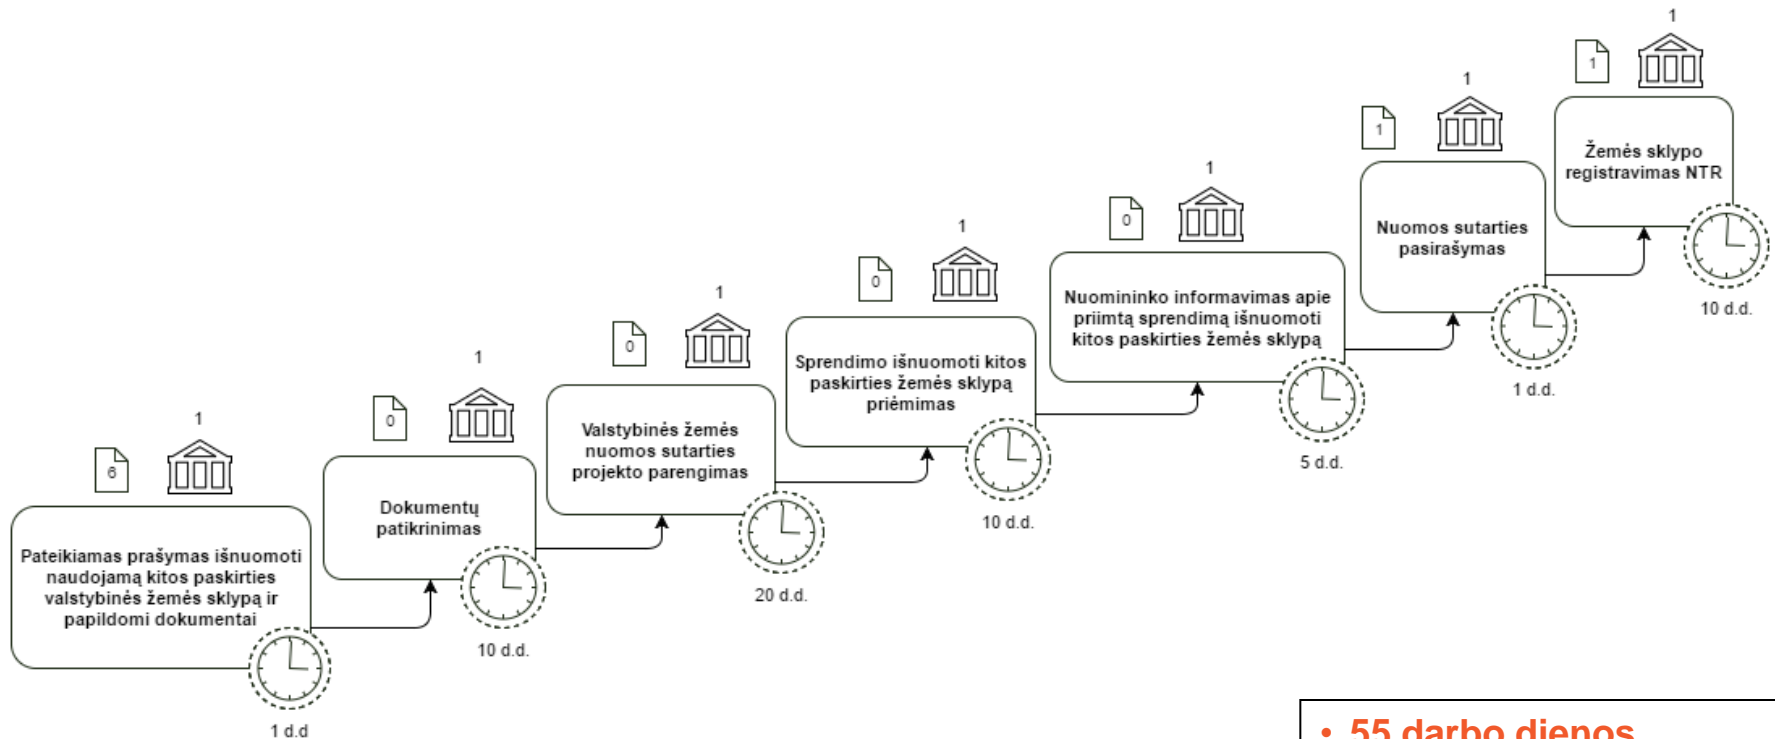


- 55 darbo dienos
- 2 institucijos / įstaigos
- 8 dokumentai



2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma

5. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas aukciono būdu

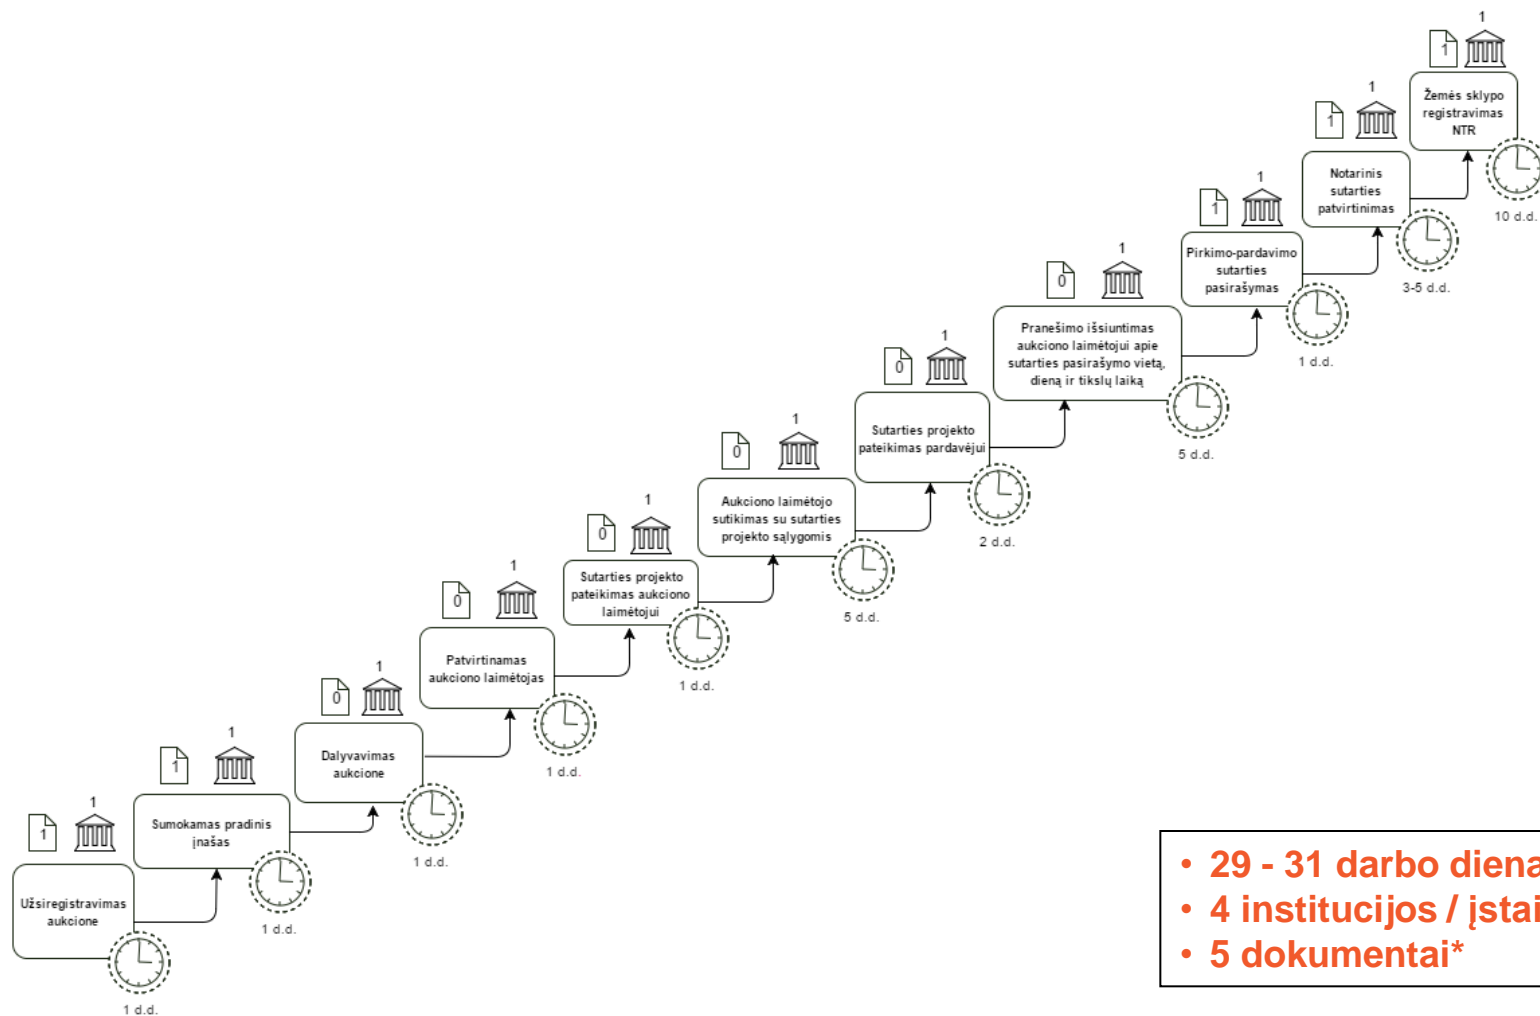


* Jei aukcionas prasideda per mažiau nei 2 d.d., tuomet reikia į sistemą įkelti mokėjimo pavidimo kopiją




2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma

6. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma aukciono būdu

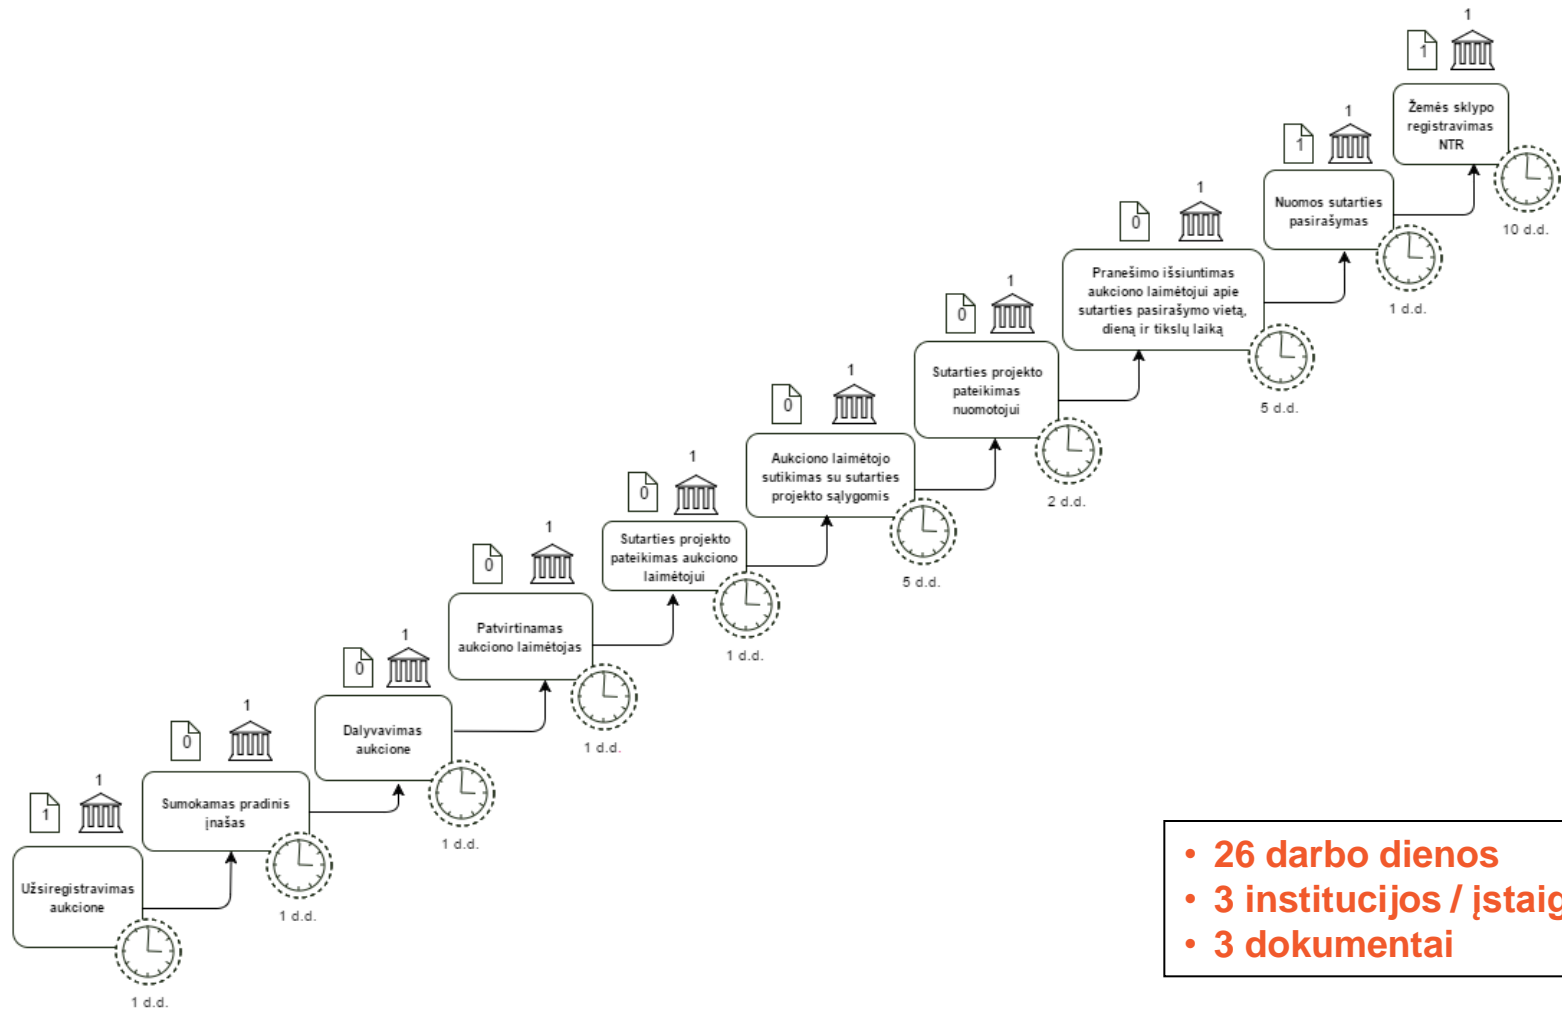


2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma

7. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas ne aukciono būdu

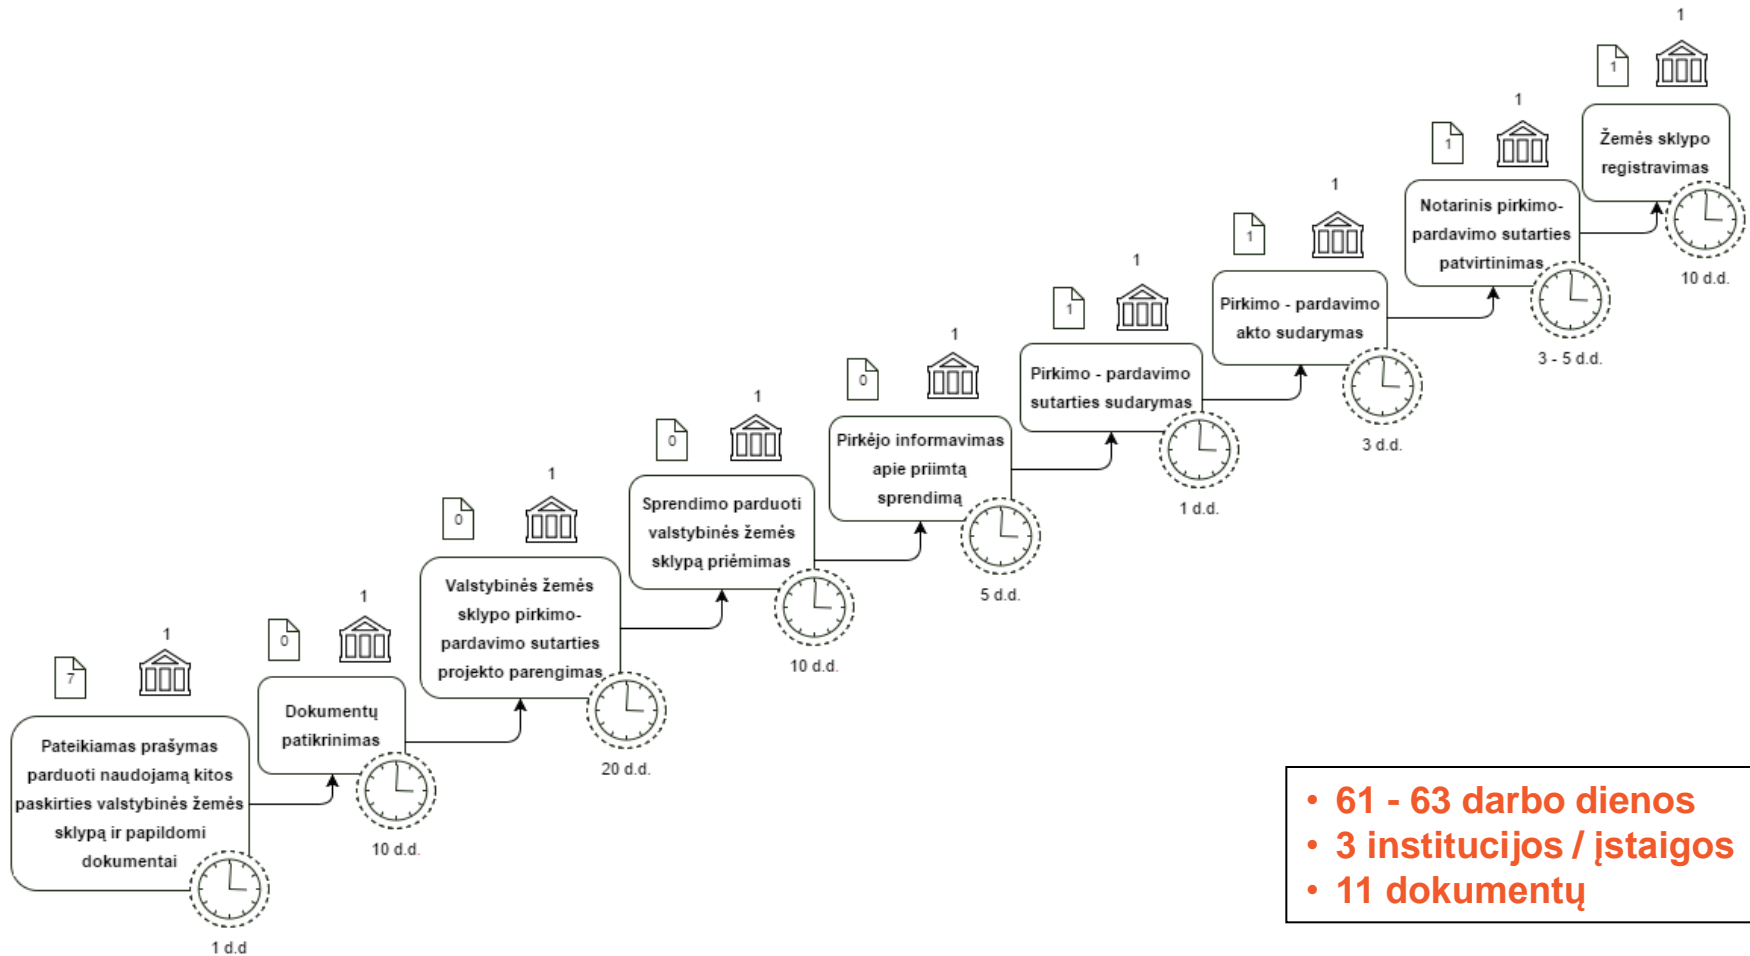

2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma

8. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma ne aukciono būdu

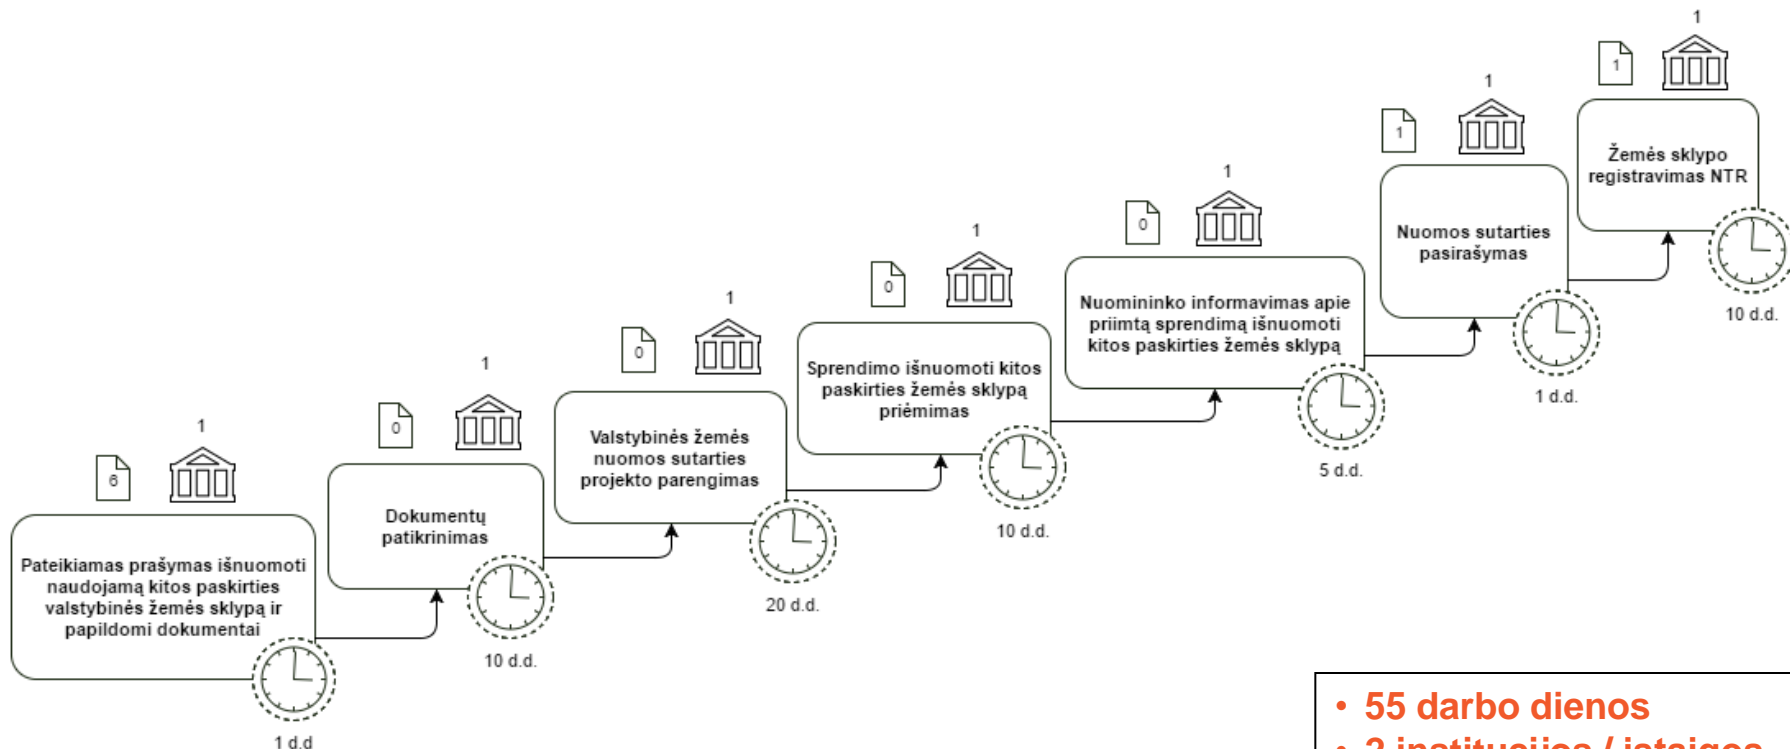

- 55 darbo dienos
- 2 institucijos / įstaigos
- 8 dokumentai

2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma


Bendra situacija

Procesas	Trukmė (d. d.)	Institucijų ir įstaigų skaičius	Dokumentų skaičius
2.1. Privačios kitos paskirties žemės įsigijimas	14-16	3	3
2.2. Privačios kitos paskirties žemės nuoma	1	1	1
3. Naudojamos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas	61-63	3	11
4. Naudojamos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma	55	2	8
5. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas aukciono būdu	29-31	4	5
6. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma aukciono būdu	26	3	3
7. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas ne aukciono būdu	61-63	3	11
8. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma ne aukciono būdu	55	2	8




3

Žemės sklypo planavimo procedūros

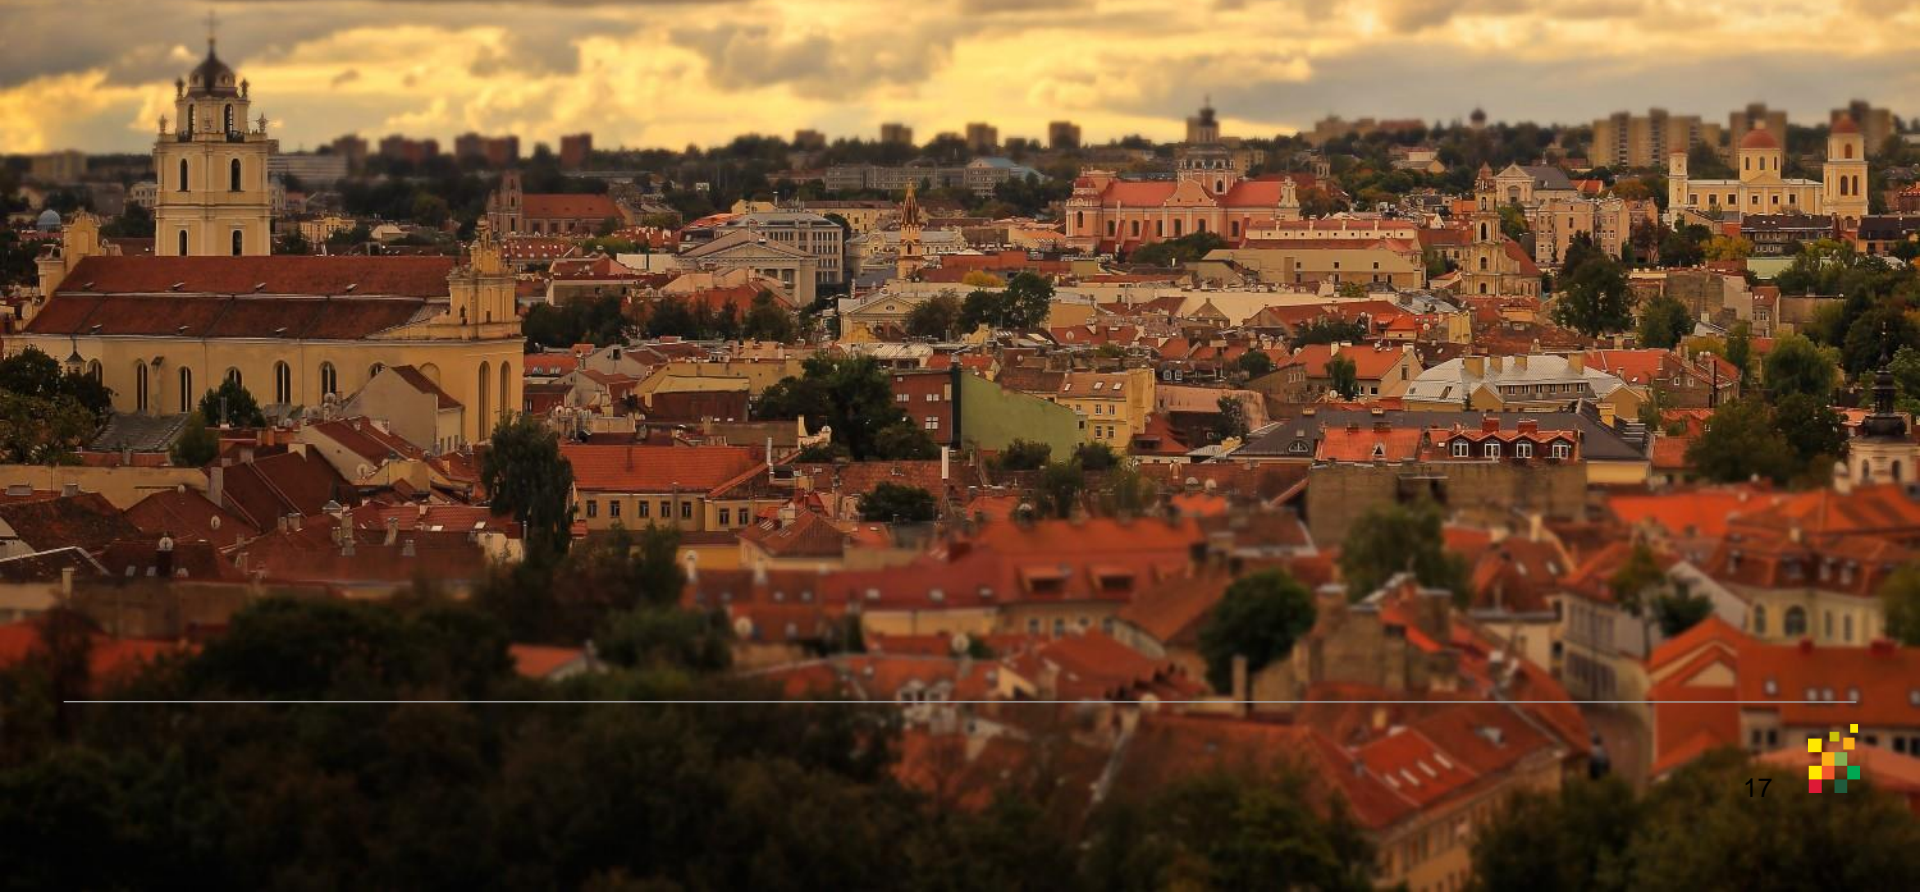

3. Žemės sklypo planavimo procedūros

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

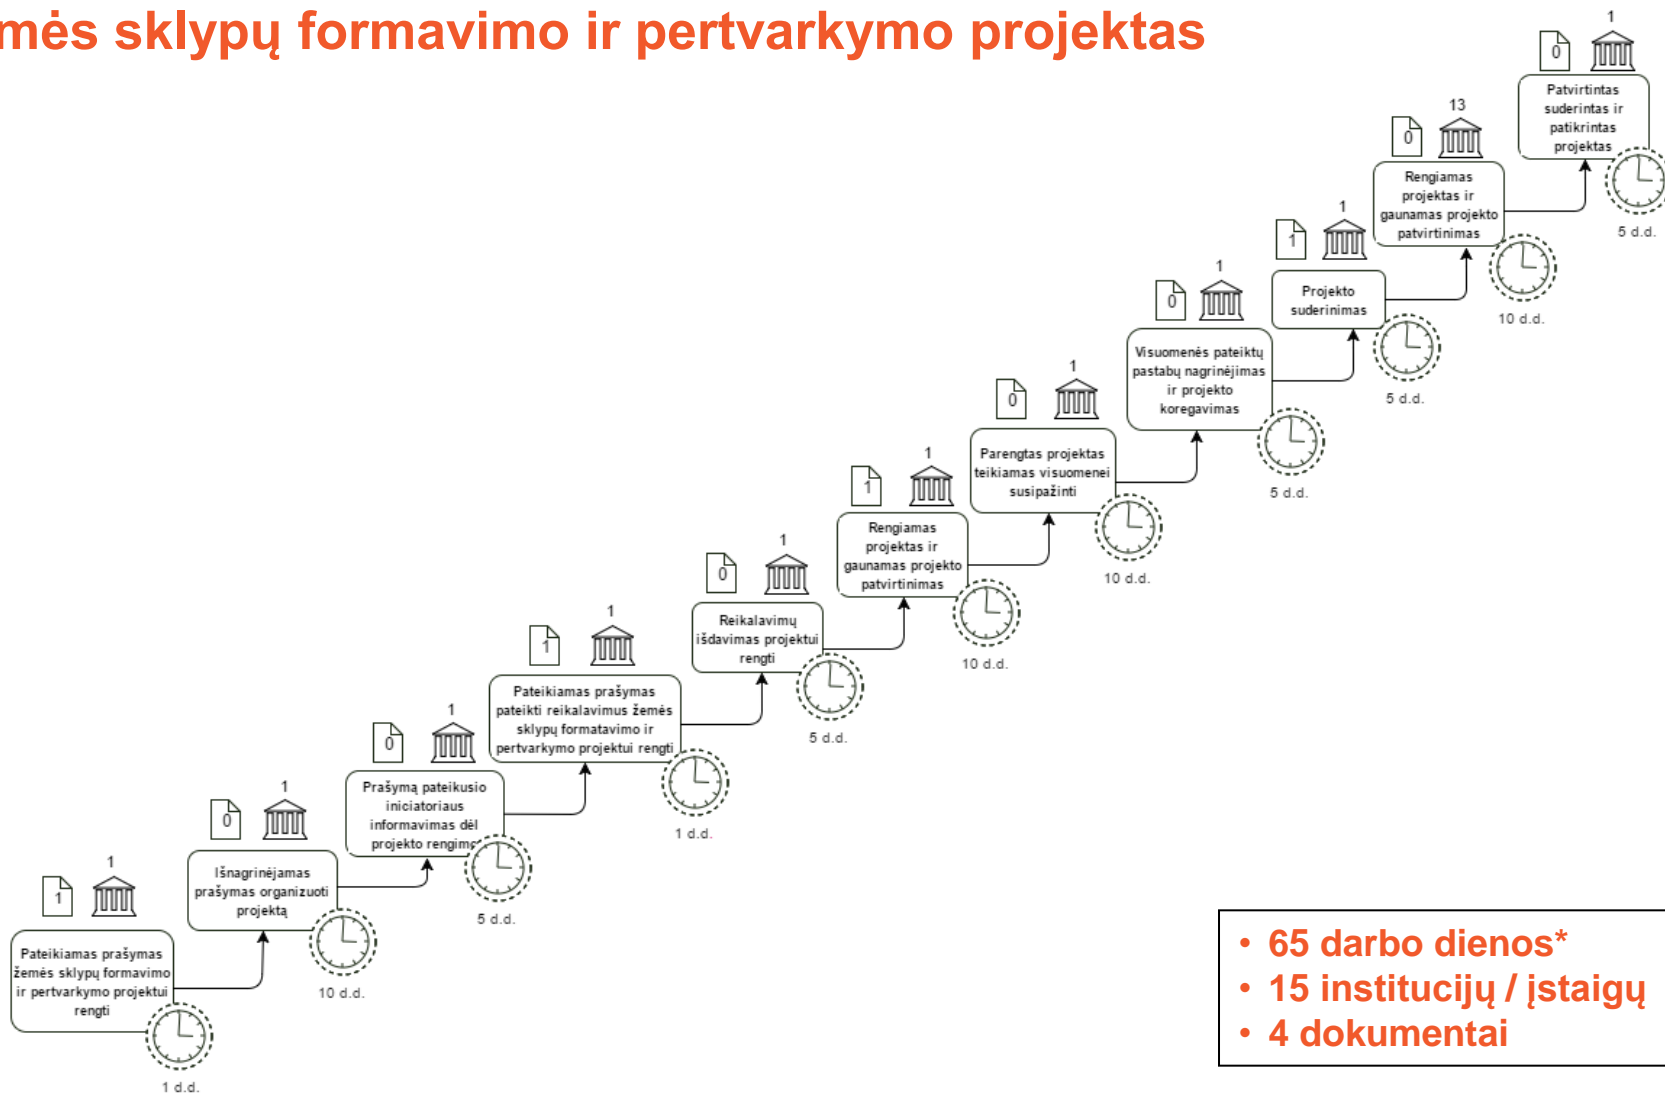

* Neįtraukiamas laikas, kuomet rengiamas projektas




4

Saugotinų želdinių kirtimas



4. Saugotinų želdinių kirtimas


1. Leidimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje




4. Saugotinių želdinių kirtimas

2. Leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas

4.2.1. Žemės įsigijimo atvejis

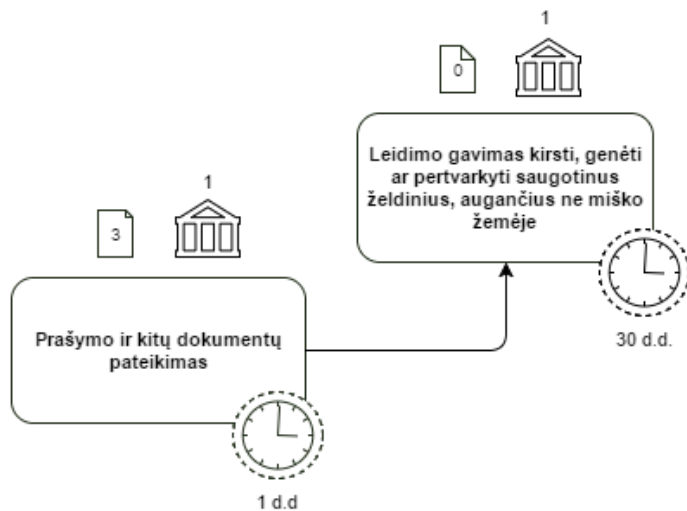

4.2.2. Žemės nuomos atvejis

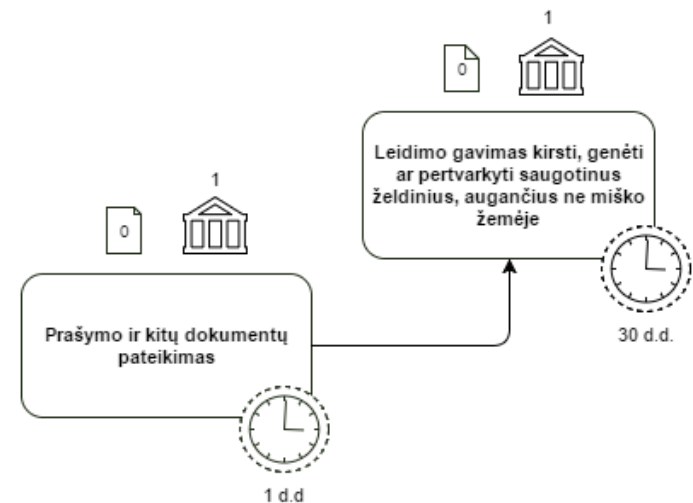

- 30 darbo dienų
- 1 institucija / įstaiga*
- 3 dokumentai**

* Žemės nuomos atveju – žemės savininkas, o įsigijimo atveju - savivaldybė

** Žemės nuomos atveju prašymą ir dokumentus pateikia žemės valdytojas, todėl investuotojui nereikia pateikti jokių dokumentų




5

Teritoriju planavimo procedūros



5. Teritoriju planavimo procedūros

1. Bendrojo plano keitimas

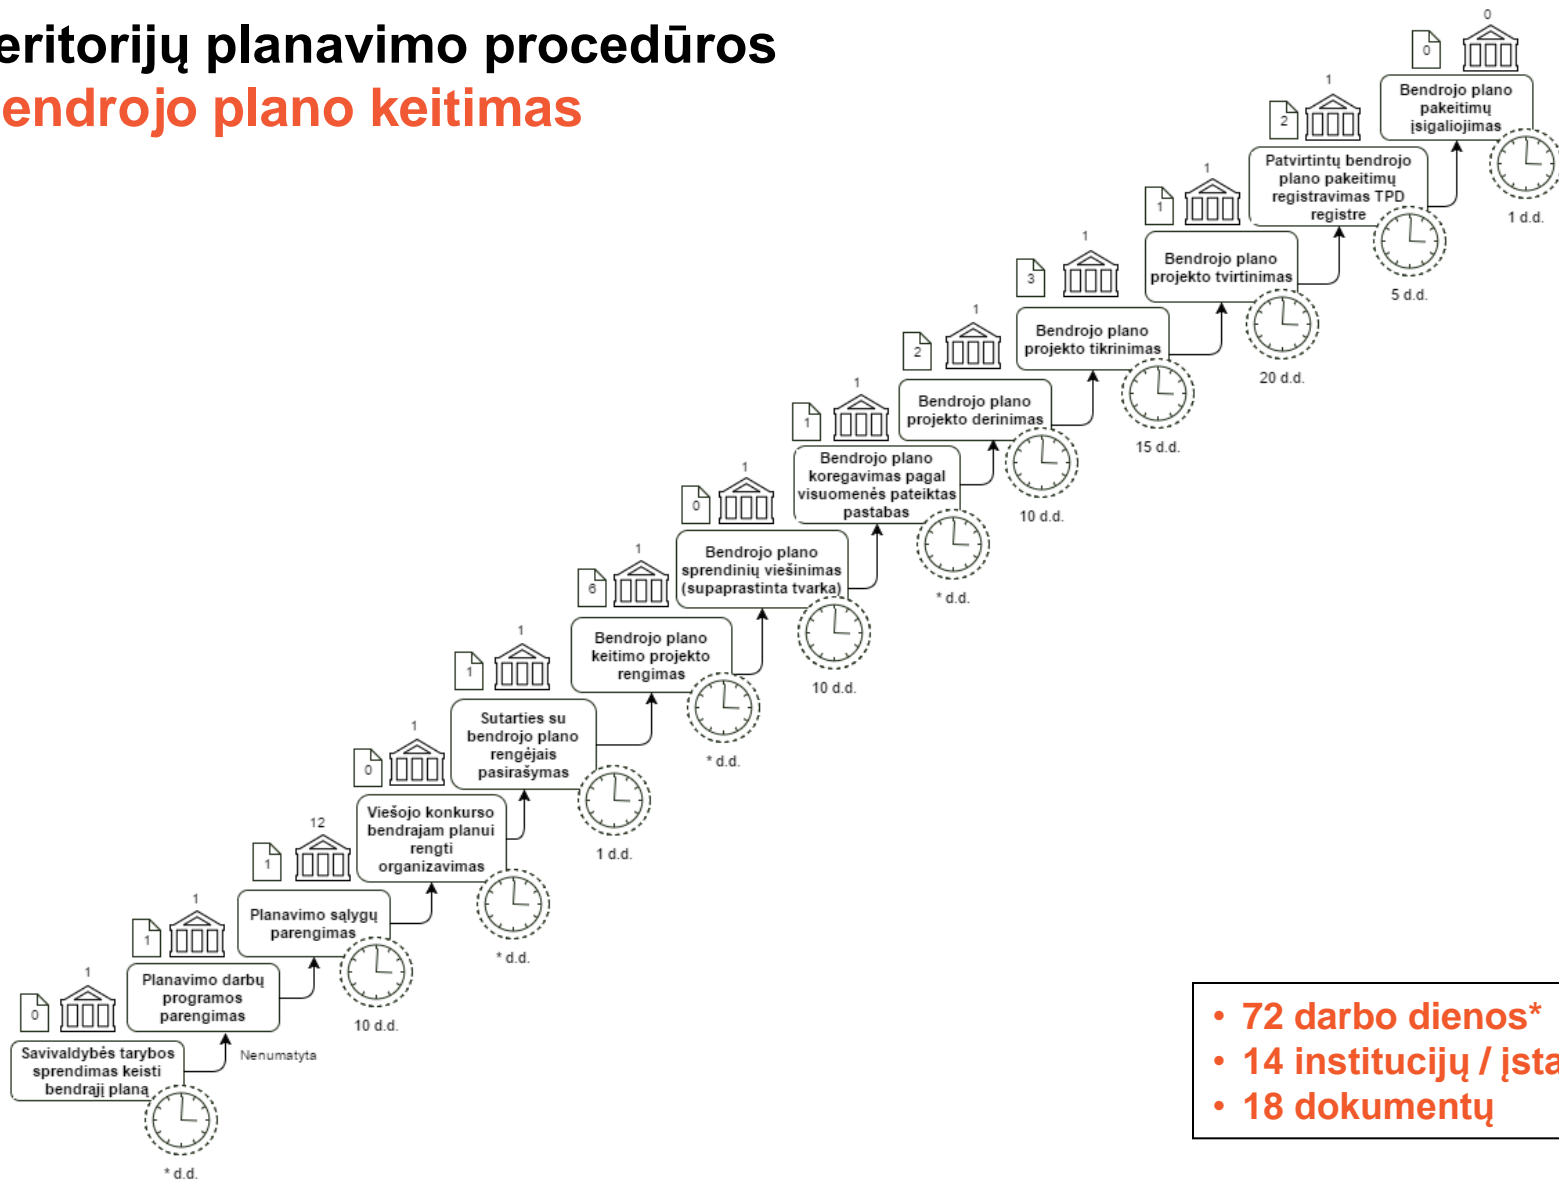


- 72 darbo dienos*
- 14 institucijų / įstaigų
- 18 dokumentų

* Neįtraukiamas laikas, skirtas viešajam konkursui ir bendrajam projektui rengti ir koreguoti



5. Teritorijų planavimo procedūros

2. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas

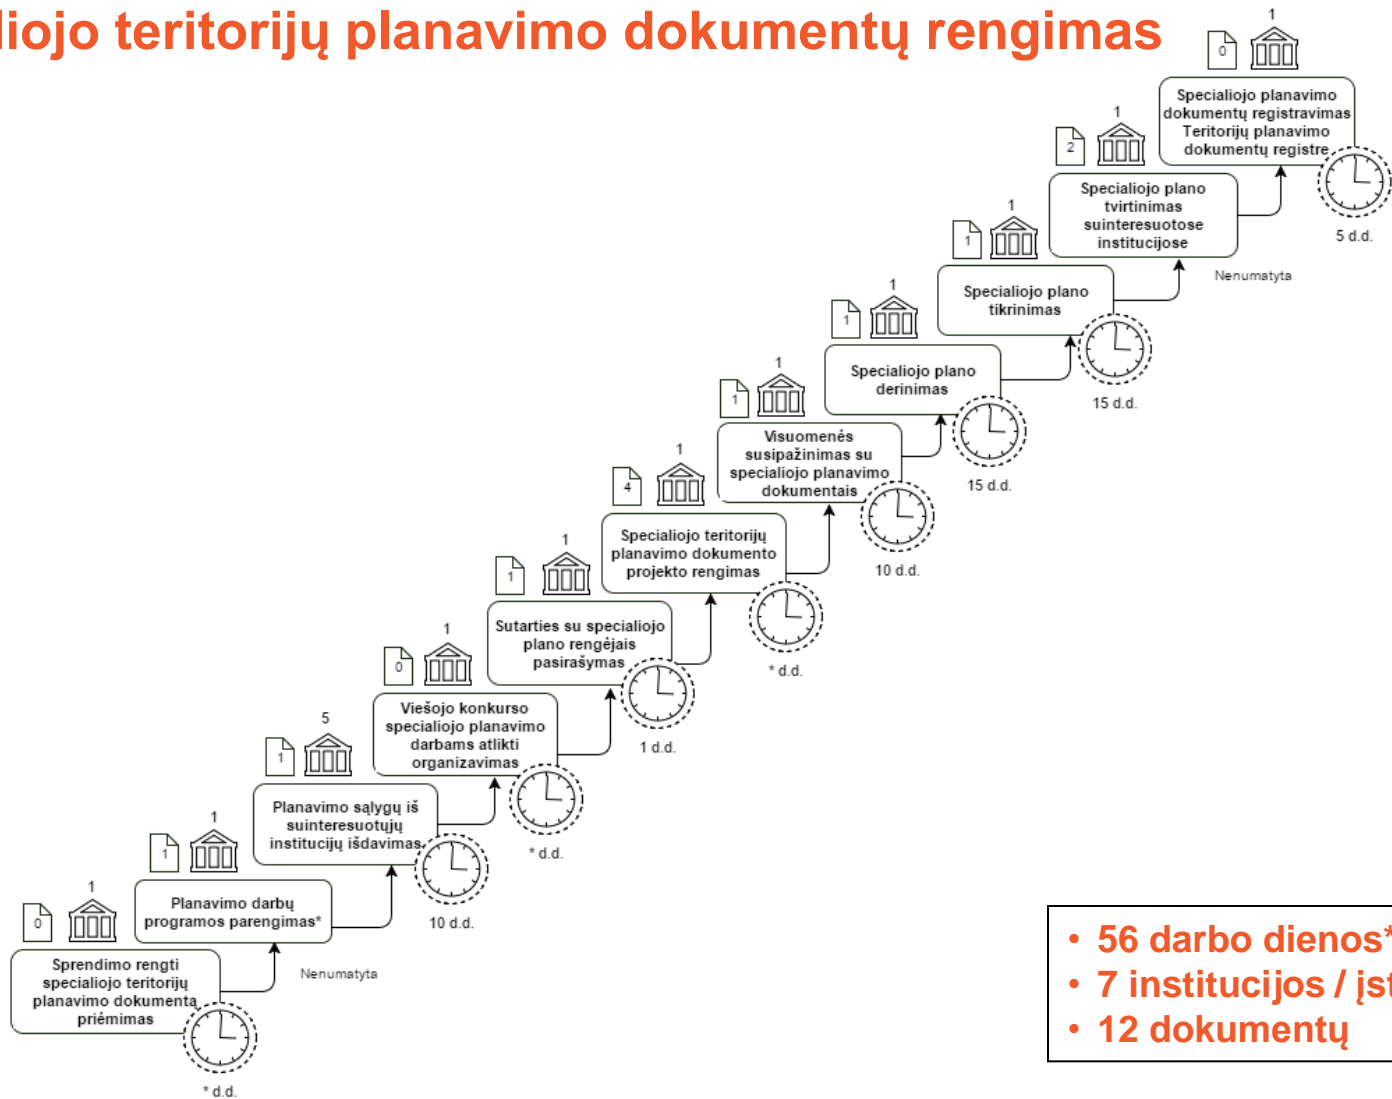


* Neįtraukiamas laikas, skirtas sprendimui priimti, viešajam konkursui ir specialiajam projektui rengti. Nėra numatytas terminas sprendiniams tikslinti ir specialiajam planui institucijose tvirtinti



5. Teritorijų planavimo procedūros

3. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas

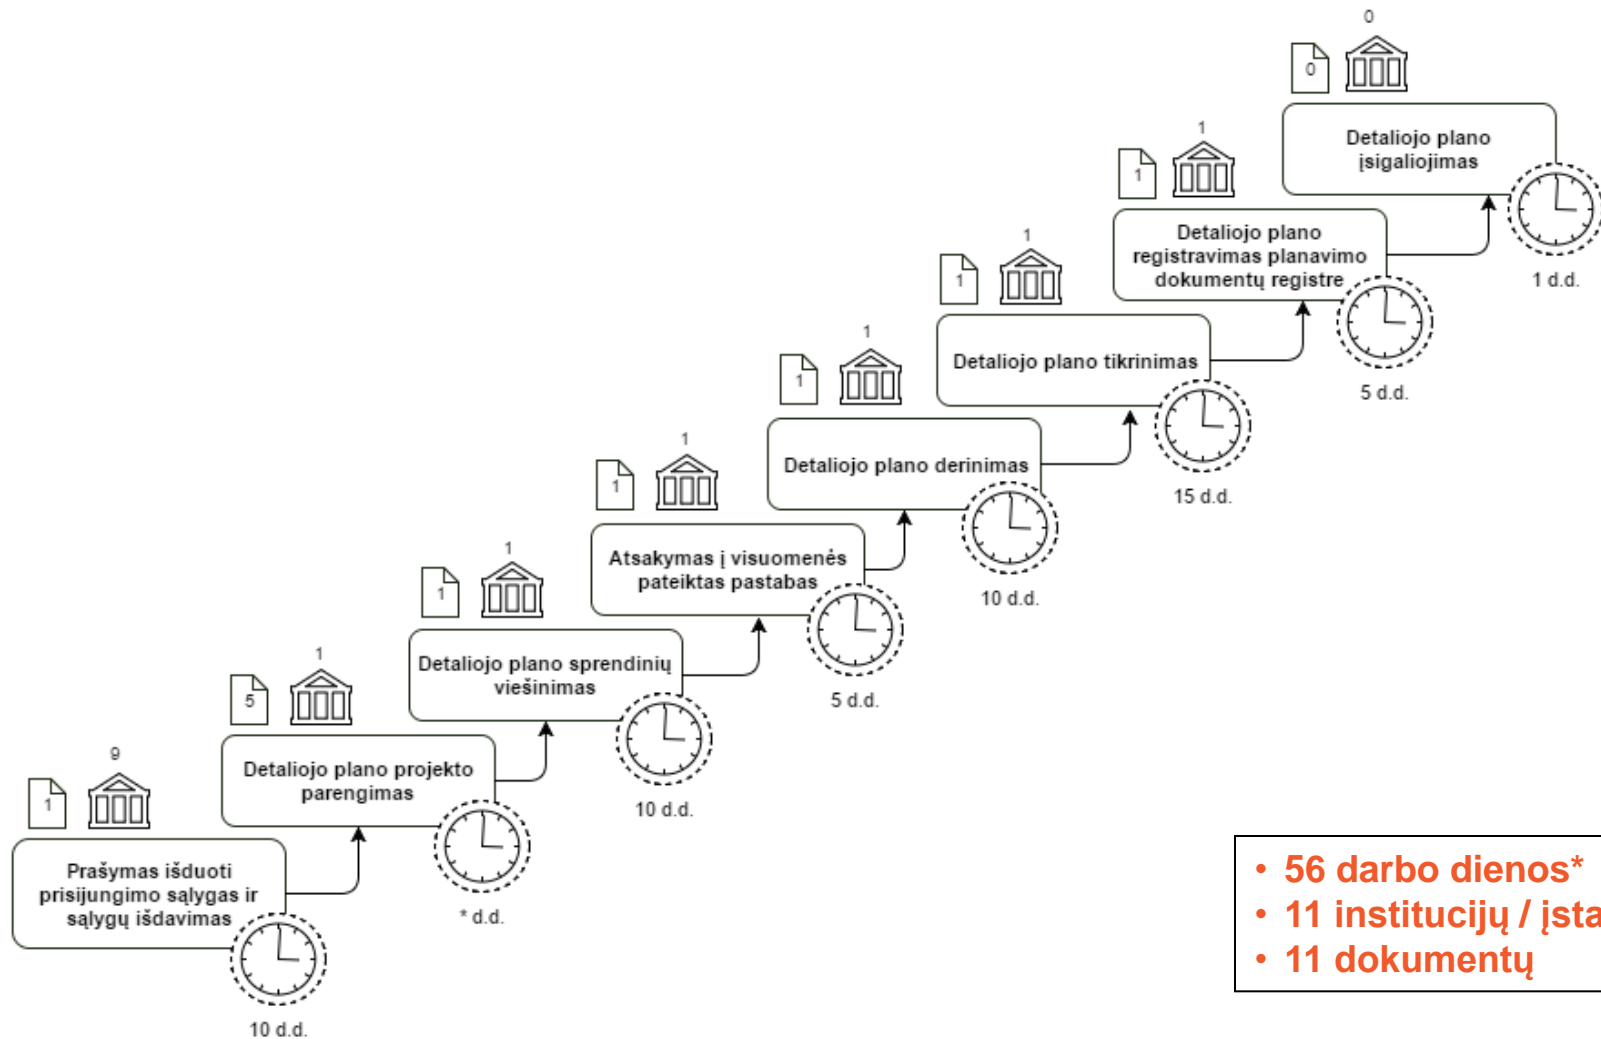


* Neįtraukiamas laikas, kuomet rengiamas projektas



5. Teritorijų planavimo procedūros

4.1. Detaliojo plano techninių klaidų, spragų taisymas

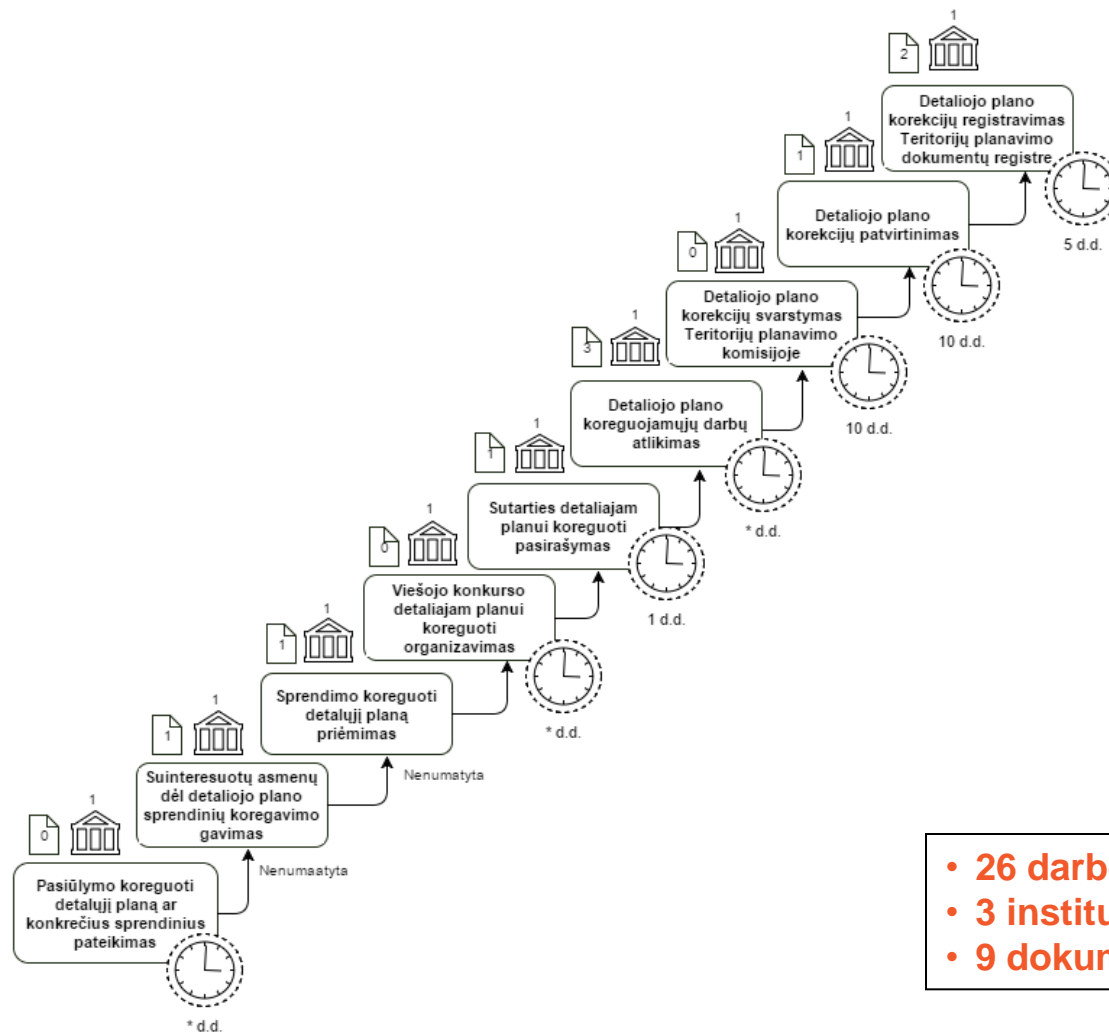

- 26 darbo dienos*
- 3 institucijos / įstaigos
- 9 dokumentai

* Neįtraukiamas laikas, skirtas viešajam konkursui ir detaliam planui koreguoti



5. Teritorijų planavimo procedūros

4.2. Detaliojo plano sprendinių koregavimas



* Neįtraukiamas laikas, skirtas viešajam konkursui ir detaliam planui koreguoti



5. Teritorijų planavimo procedūros

Bendra situacija

Procesas	Trukmė (d. d.)	Institucijų ir įstaigų skaičius	Dokumentų skaičius
1. Bendrojo plano keitimas	72	14	18
2. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas	56	7	12
3. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas	56	11	11
4.1. Detaliojo plano techninių klaidų, spragų taisymas	26	3	9
4.2. Detaliojo plano sprendinių koregavimas	51	10	12
Iš viso:	184	32	41




6

Aplinkos apsaugos procedūros



6. Aplinkas apsaugas procedūras

1. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV)

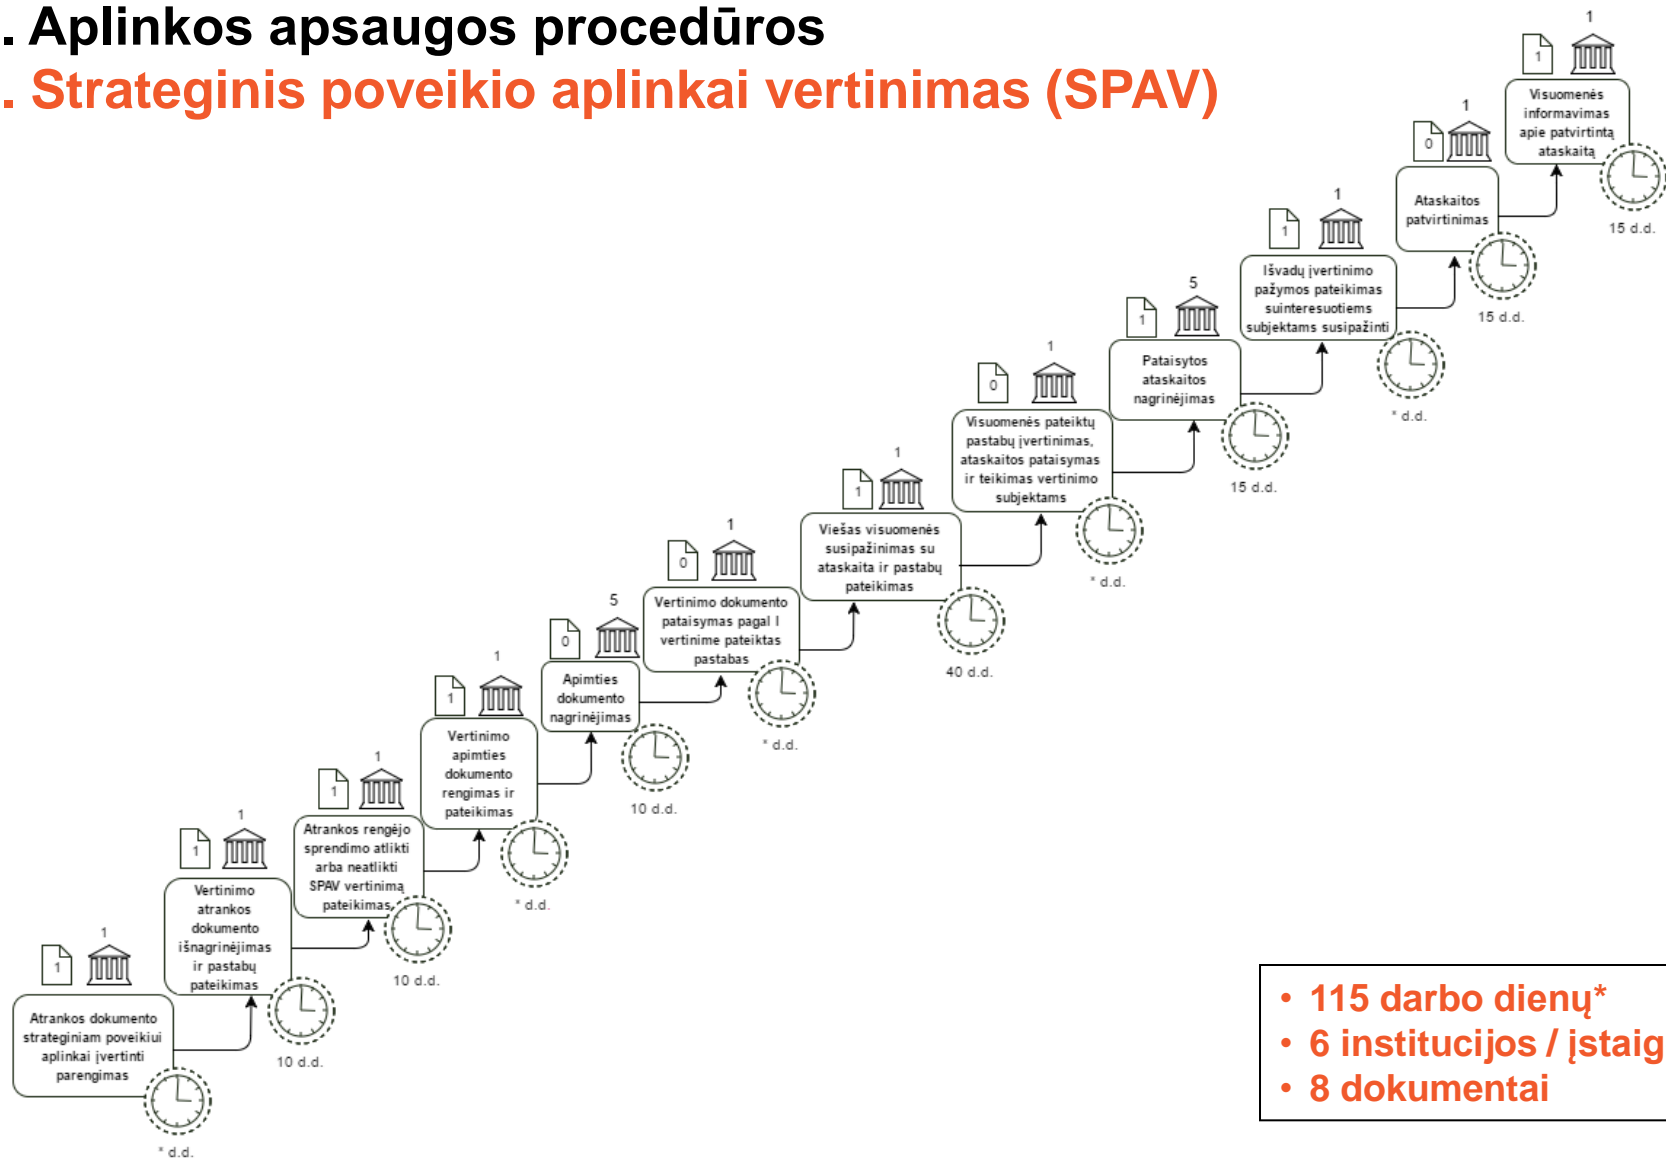


* Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia dokumentus



6. Aplinkos apsaugos procedūros

2.1. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

ATRANKA

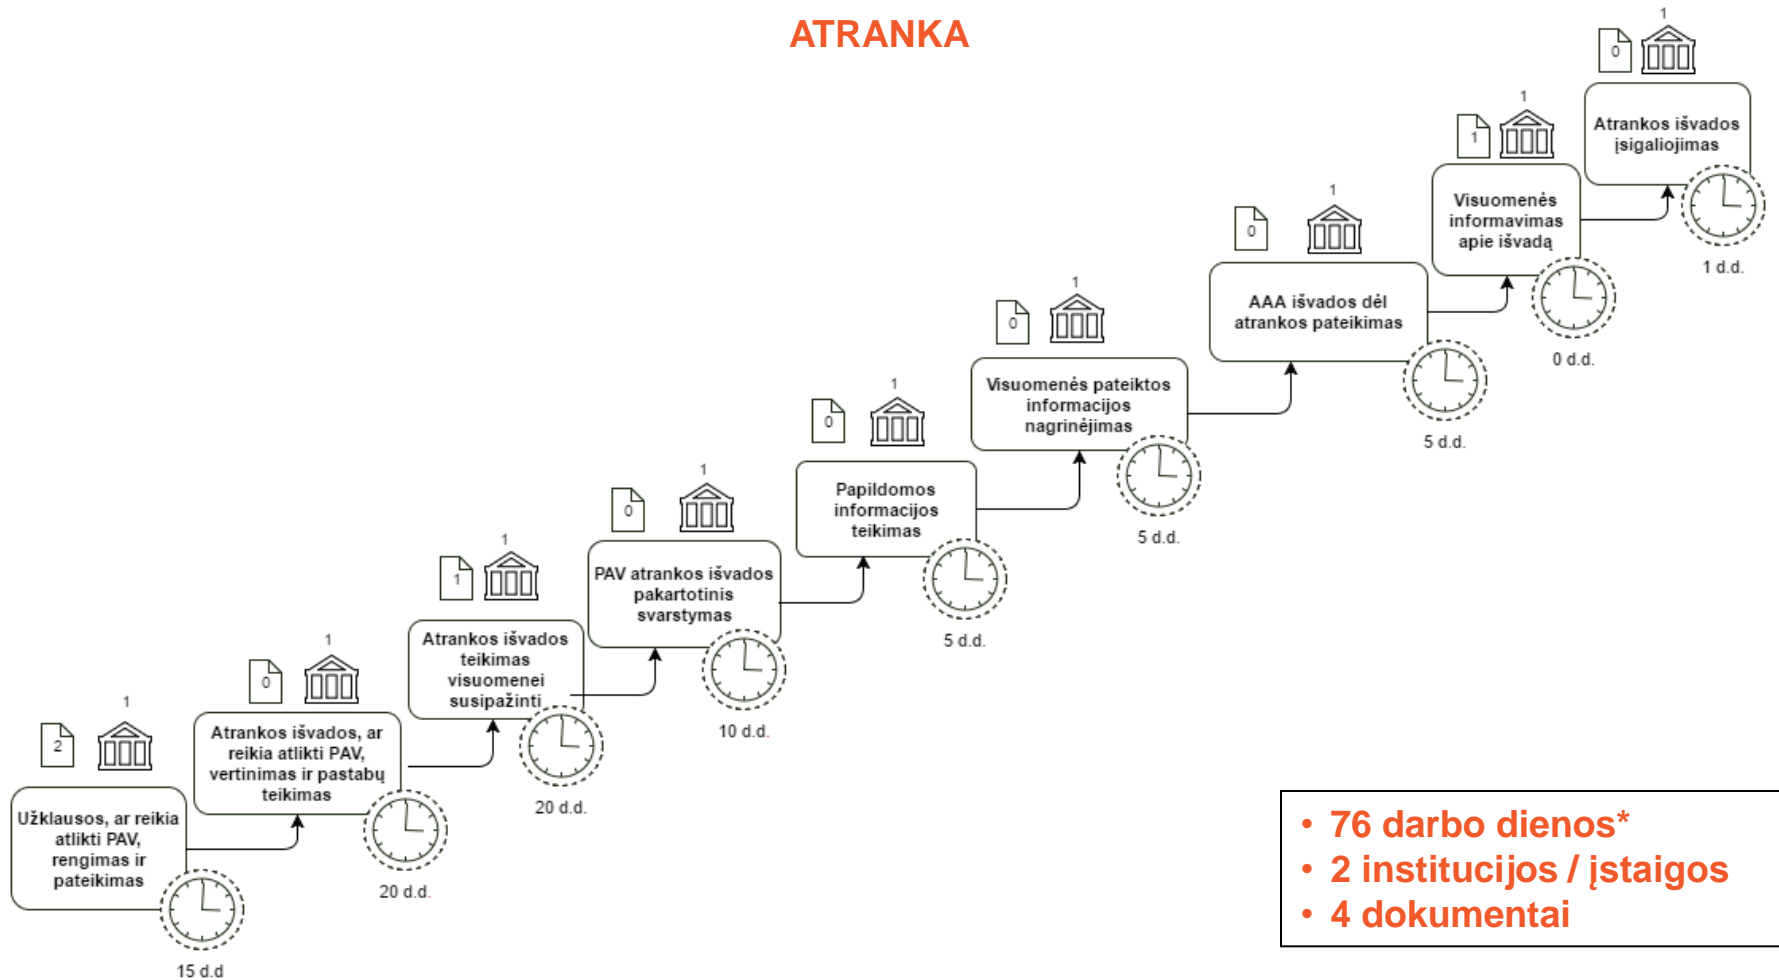


* Analizuojamas idealus atvejis, kuomet dokumentų taisymas nereikalingas



6. Aplinkos apsaugos procedūras

2.2. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

PROGRAMA

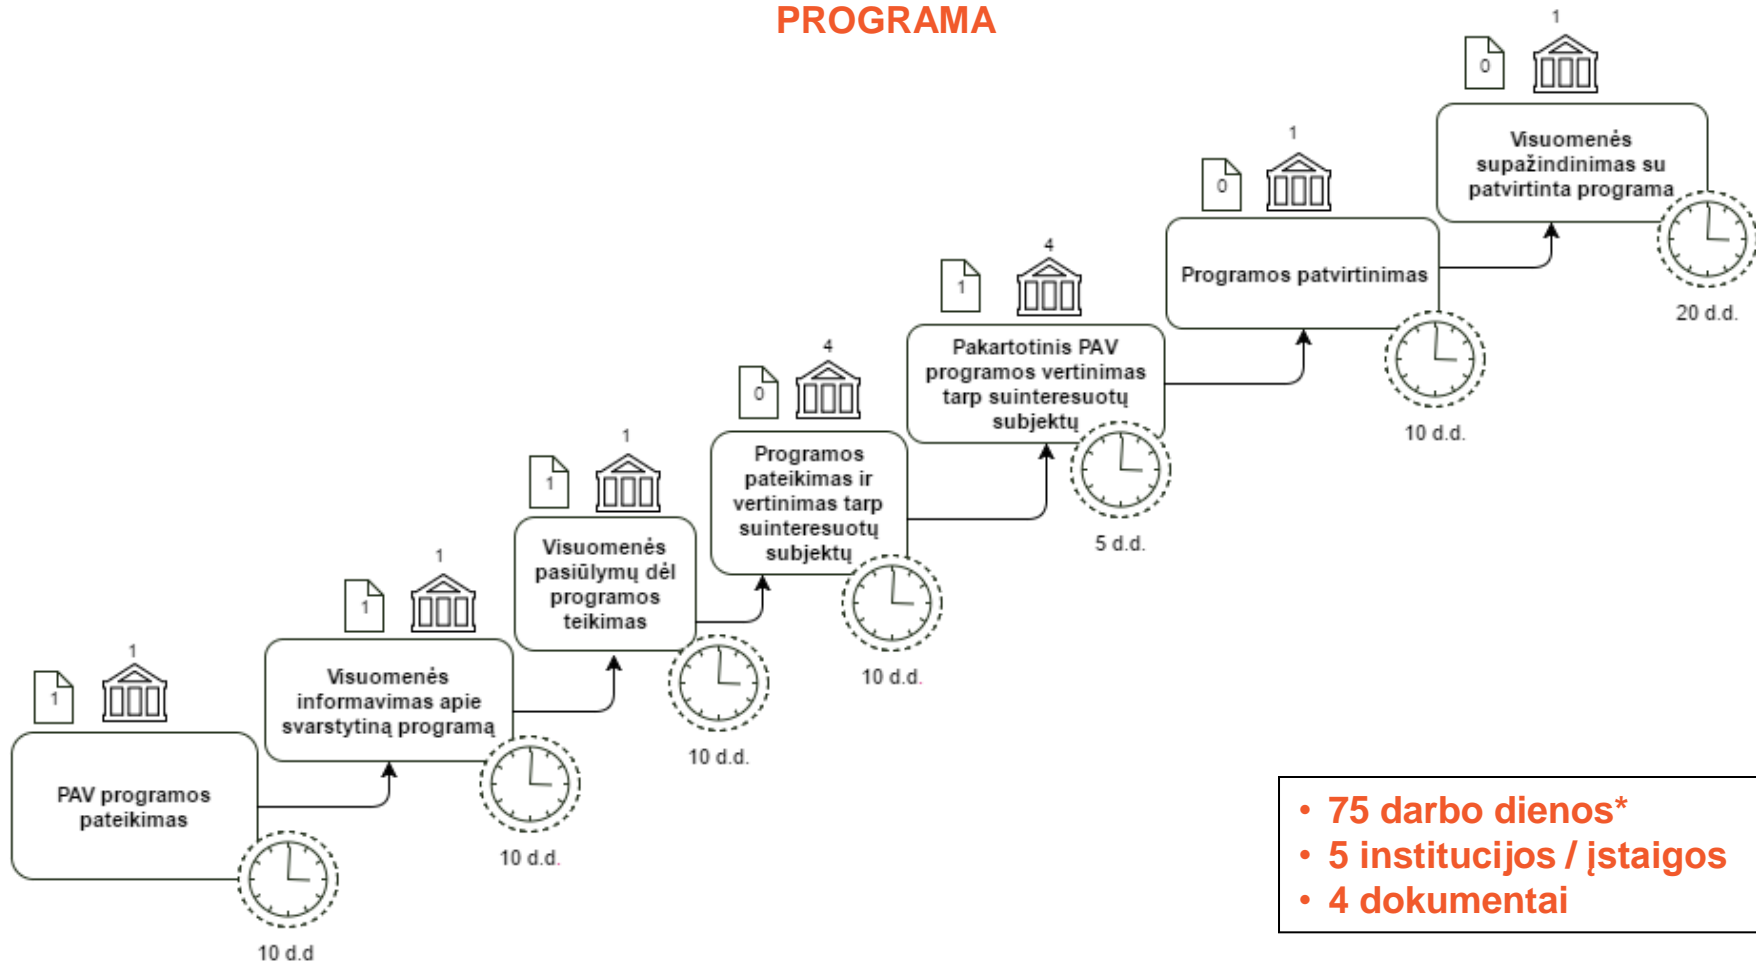


* Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia dokumentus



6. Aplinkos apsaugos procedūros

2.3. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

ATASKAITA

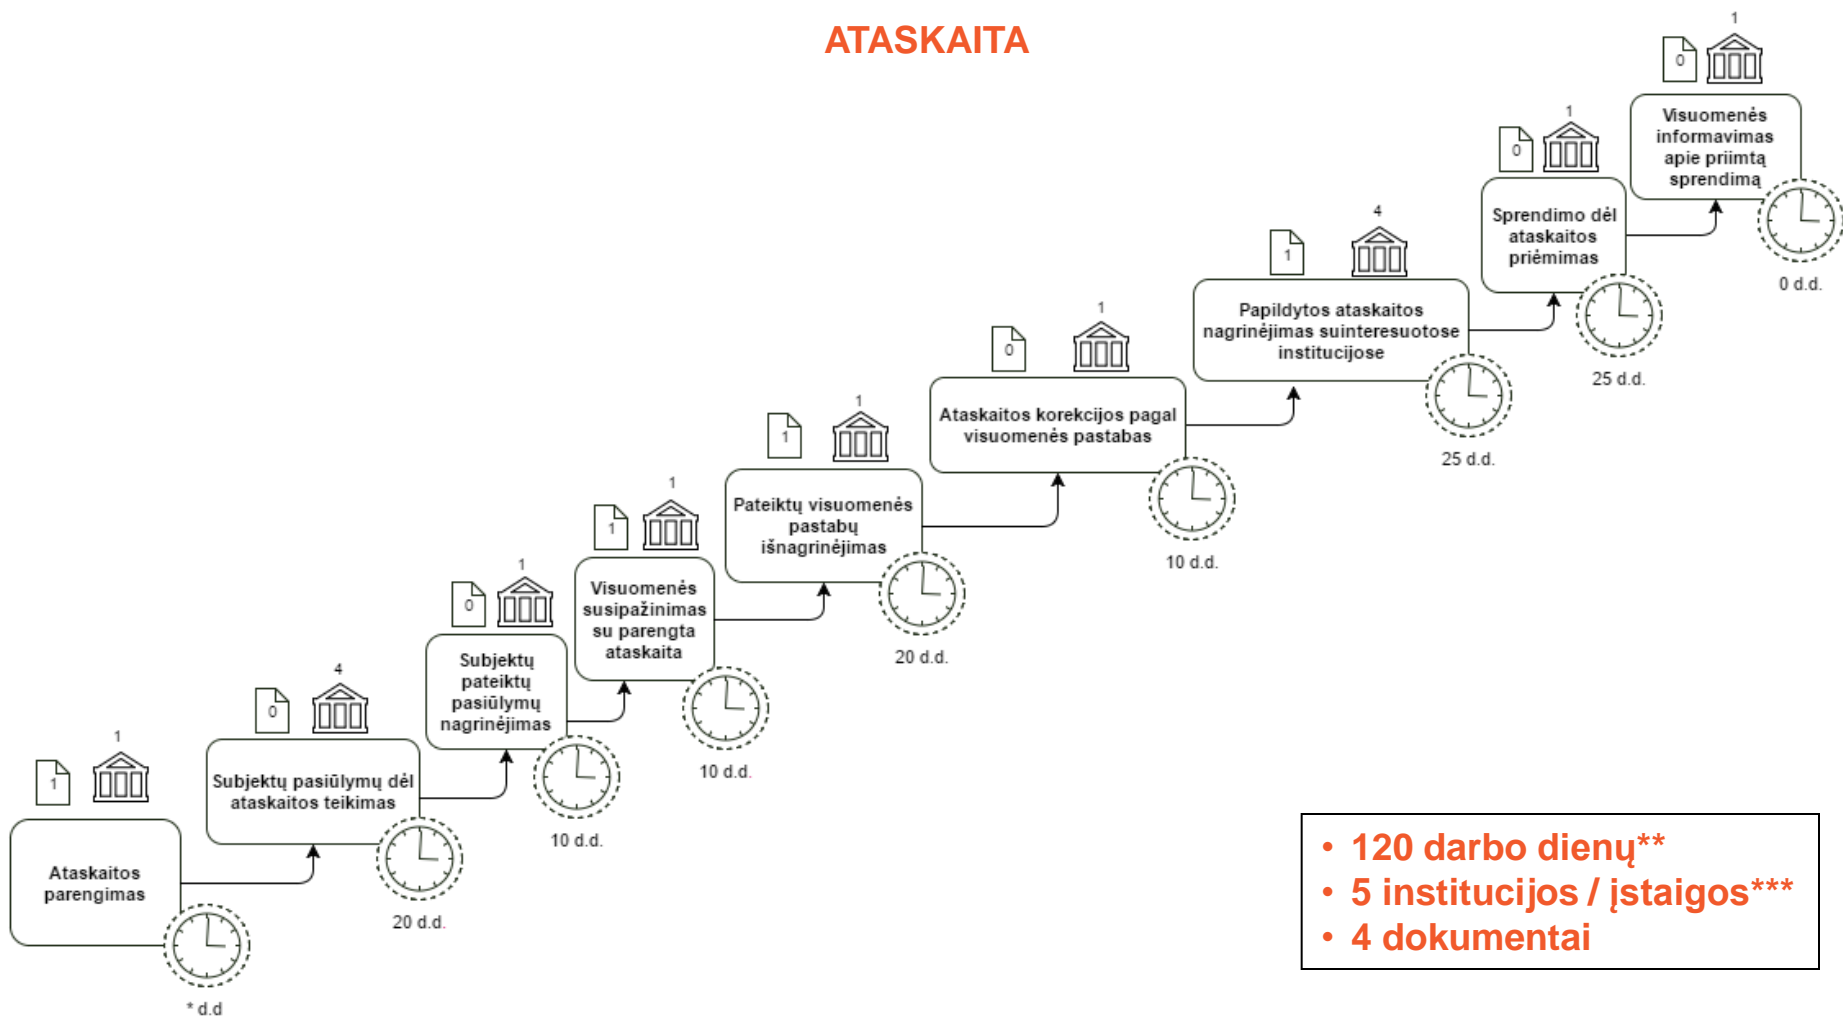

* Neįvertinamas laikas, skirtas ataskaitai parengti. Analizuojamas idealus atvejis, kuomet dokumentų taisymas nereikalingas


** Neįvertinamas laikas, kuris sugaištamasis laikas, kuomet privatus asmuo rengia dokumentus

*** Papildomai gali daugiau institucijų, tačiau jų įsitraukimas priklauso nuo konkretaus atvejo



6. Aplinkos apsaugos procedūros

3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSU)

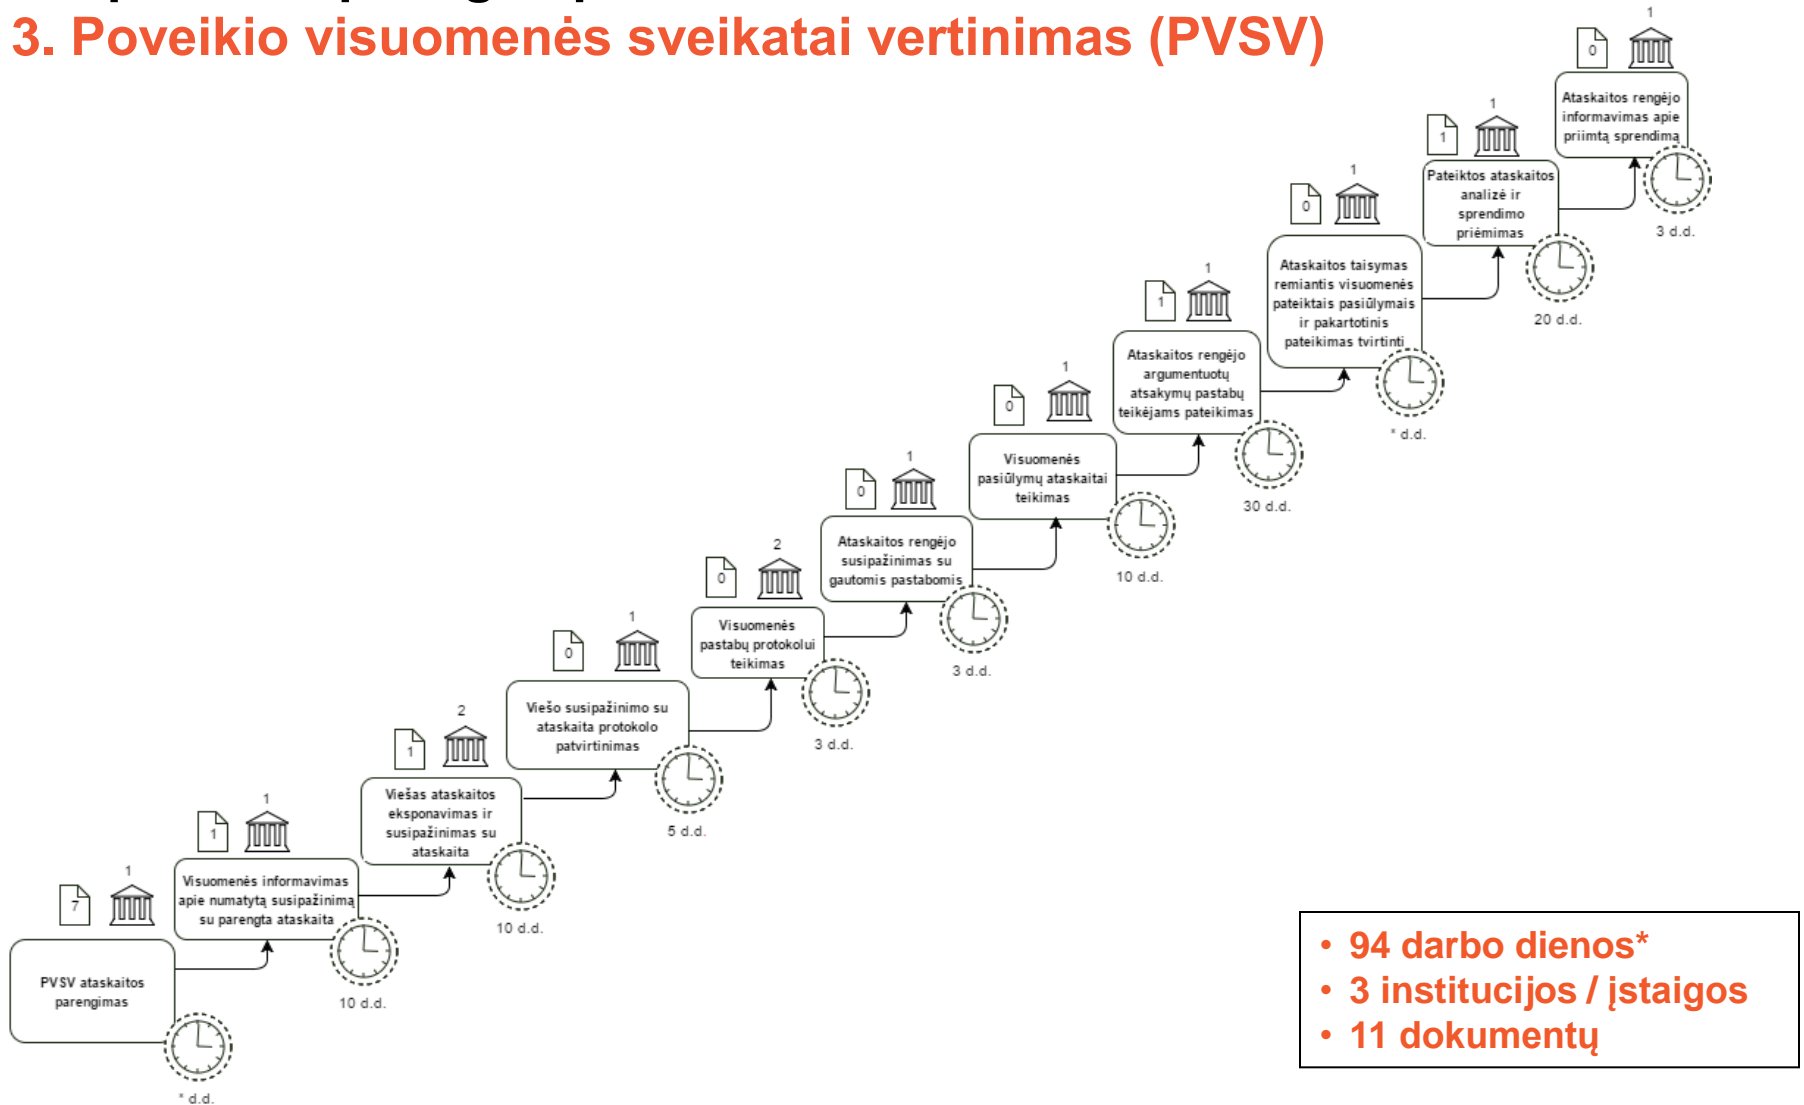

- 94 darbo dienos*
- 3 institucijos / įstaigos
- 11 dokumentų

* Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia ataskaitą. Dienos skaičiuojamos idealiu atveju, kuomet nereikia pateikti papildomos informacijos ar dokumentų



6. Aplinkos apsaugos procedūras

Bendra situacija

Procesas	Trukmė (d. d.)	Institucijų ir įstaigų skaičius	Dokumentų skaičius
1. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV)	115	6	8
2. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)	271	12	12
3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)*	94	3	11
Iš viso:	271	21	31

* Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas atskirai ir nėra PAV dalis



7

Statybos proceso organizavimas



7. Statybos proceso organizavimas

Nuo projektinių pasiūlymų iki statybos darbų užbaigimo



- 64 - 80 darbo dienų
- 6 institucijos / įstaigos
- 60 dokumentų

* Jei nėra detalaus plano, tuomet reikia parengti projektinius pasiūlymus. Šiame etape neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia projektinius pasiūlymus

** Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami statinio techninio projekto rengimo ir statybos darbai

*** Neįvertinamas laikas, kuomet įrengiama infrastruktūra (šis procesas pateikiamas 8 dalyje). Infrastruktūros tinklų įrengimas vyksta kartu su statybos darbais




8

Inžinerinēs infrastruktūros īrengimas



8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas

1. Prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų

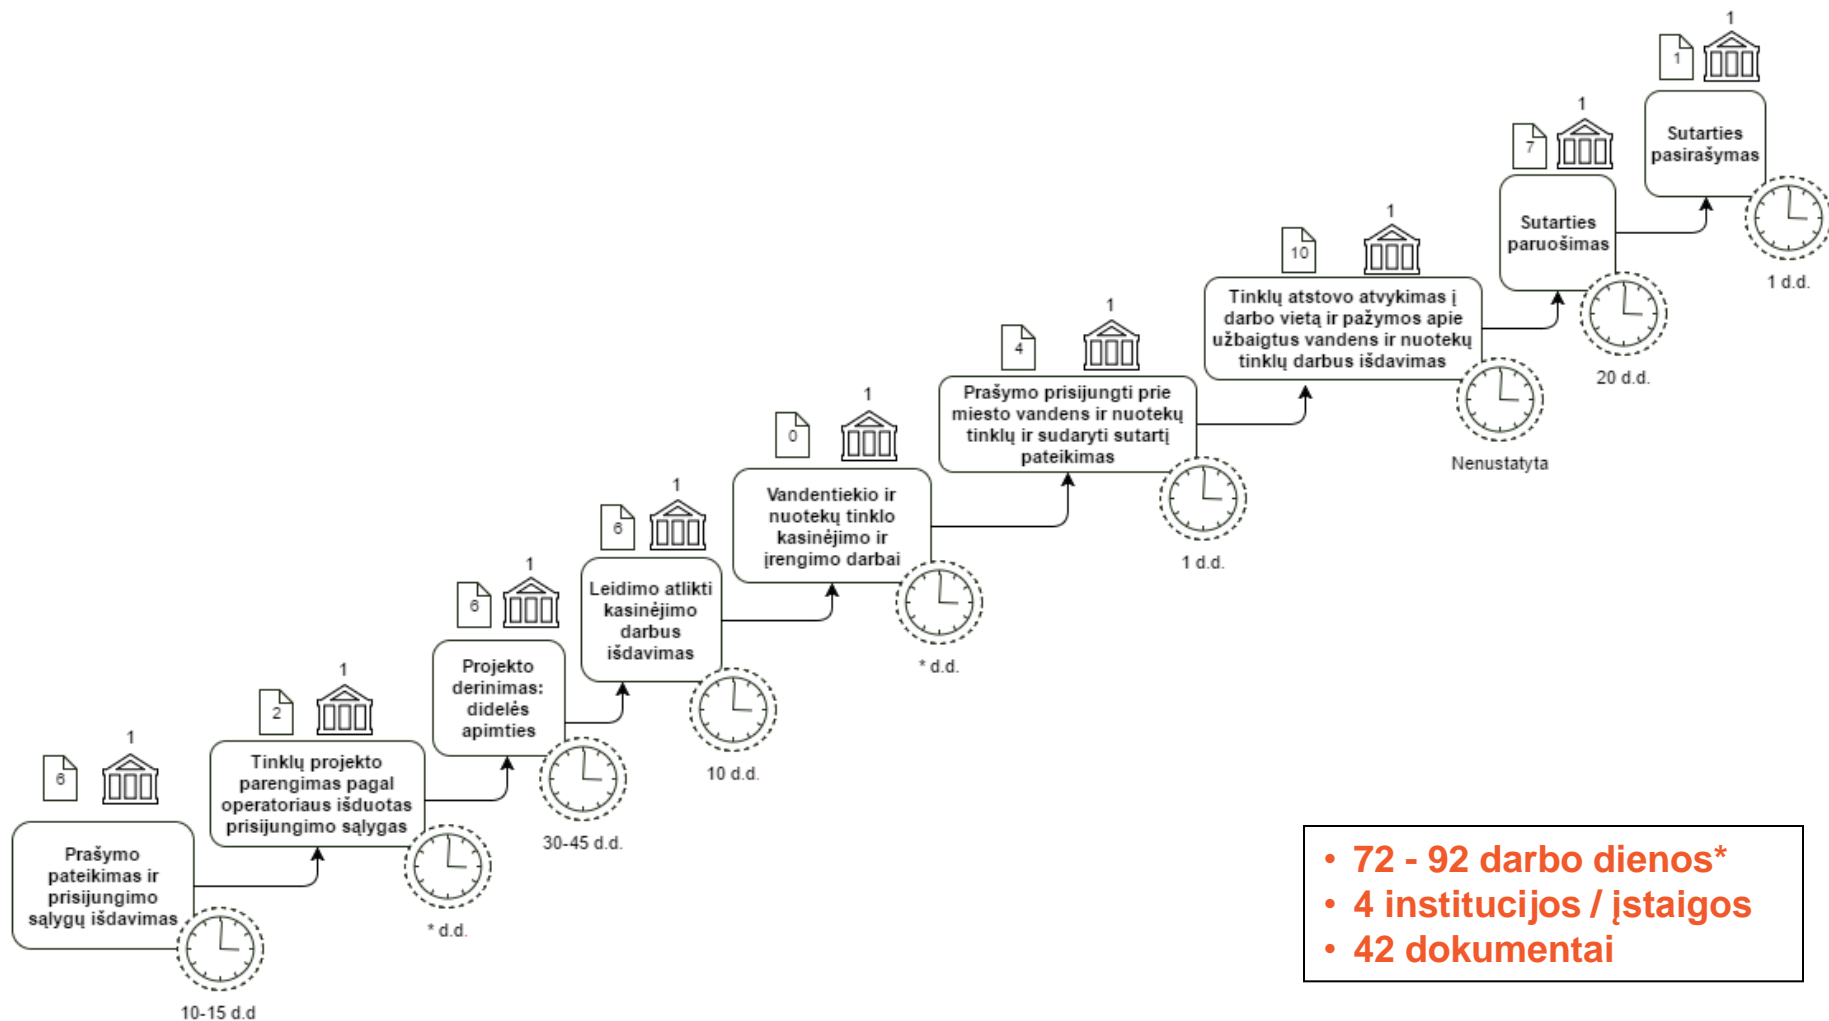


* Neįvertinamas laikas, skirtas vandens ir nuotekų projektavimo darbams atlikti ir tinklams įrengti



8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas

2. Prisijungimas prie vietinės reikšmės kelio infrastruktūros

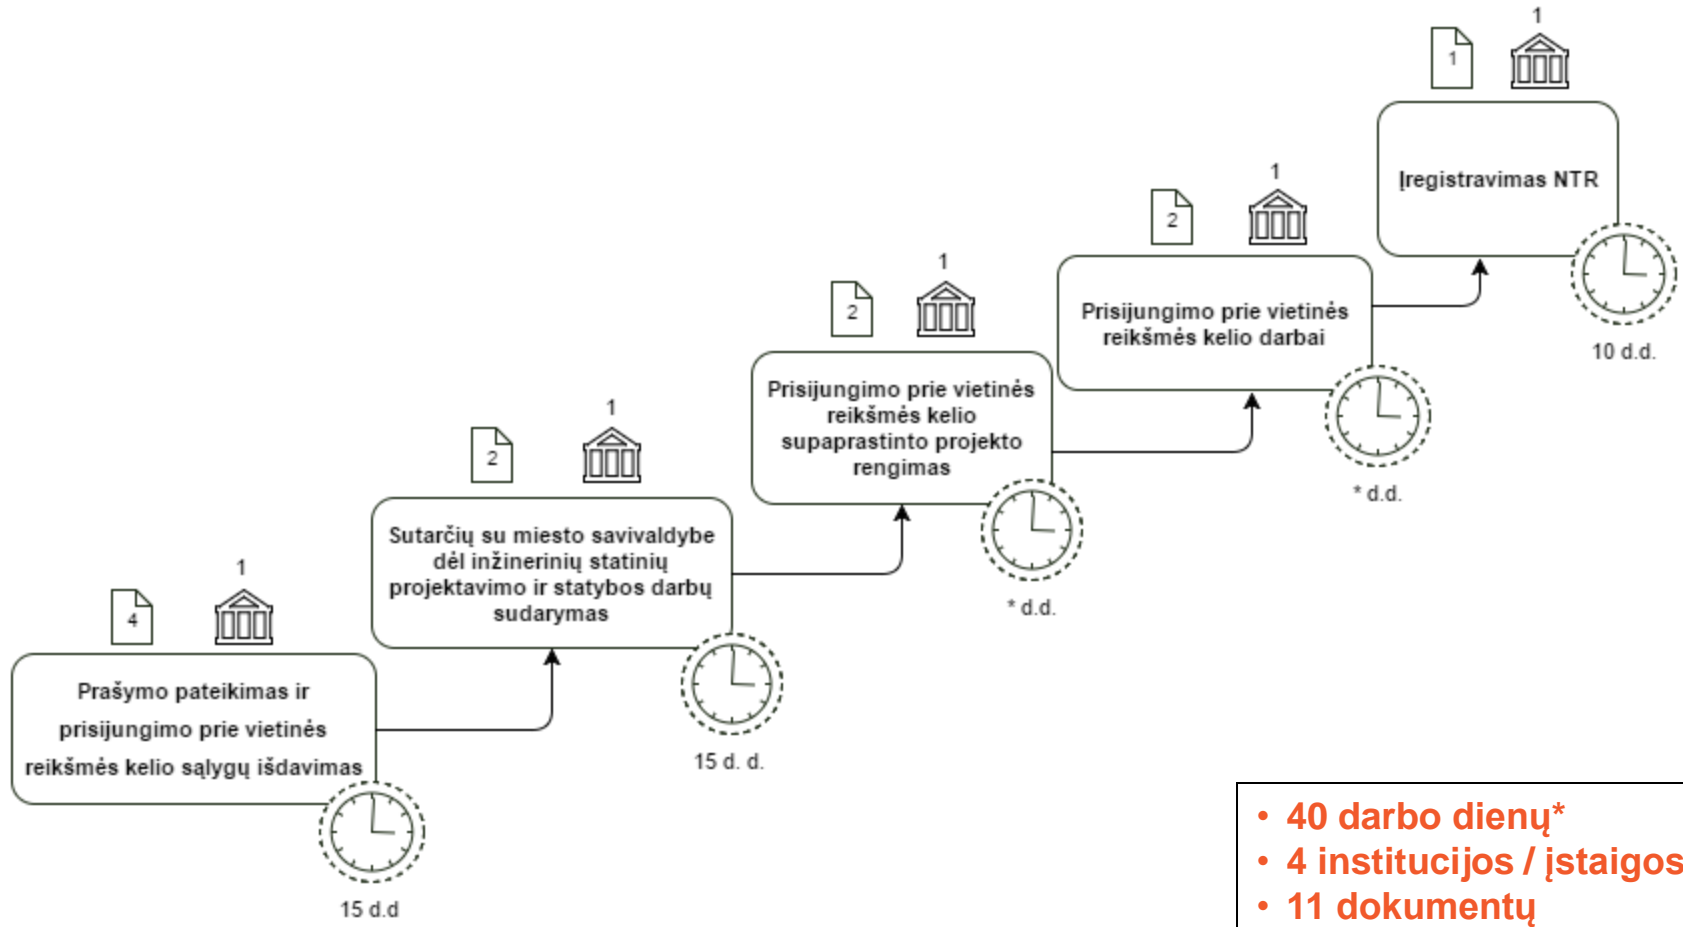


* Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami projektavimo ir statybos darbai



8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas

3. Prisijungimas prie elektros skirstymo tinklų

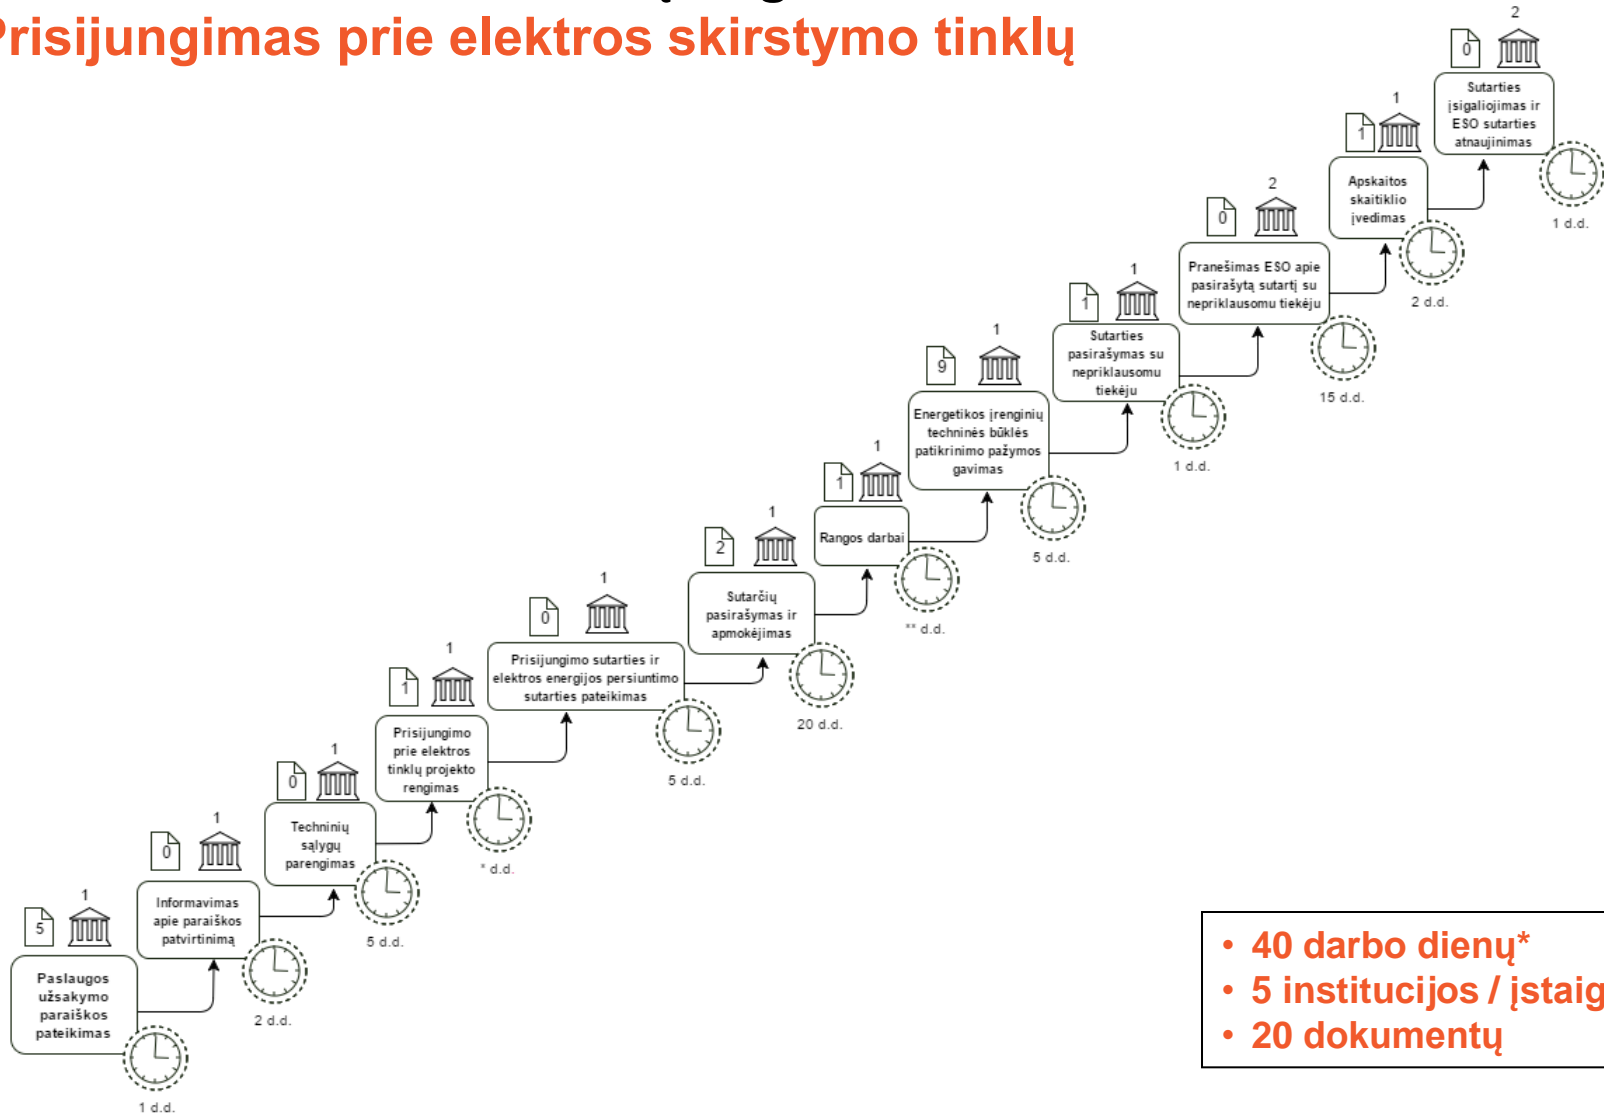


- 40 darbo dienų*
- 5 institucijos / įstaigos
- 20 dokumentų

* Neįvertinamas laikas, kuomet rengiamas prisijungimo prie elektros tinklų projektas

** Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami elektros tinklų statybos darbai

8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas

4. Prisijungimas prie dujų tinklų

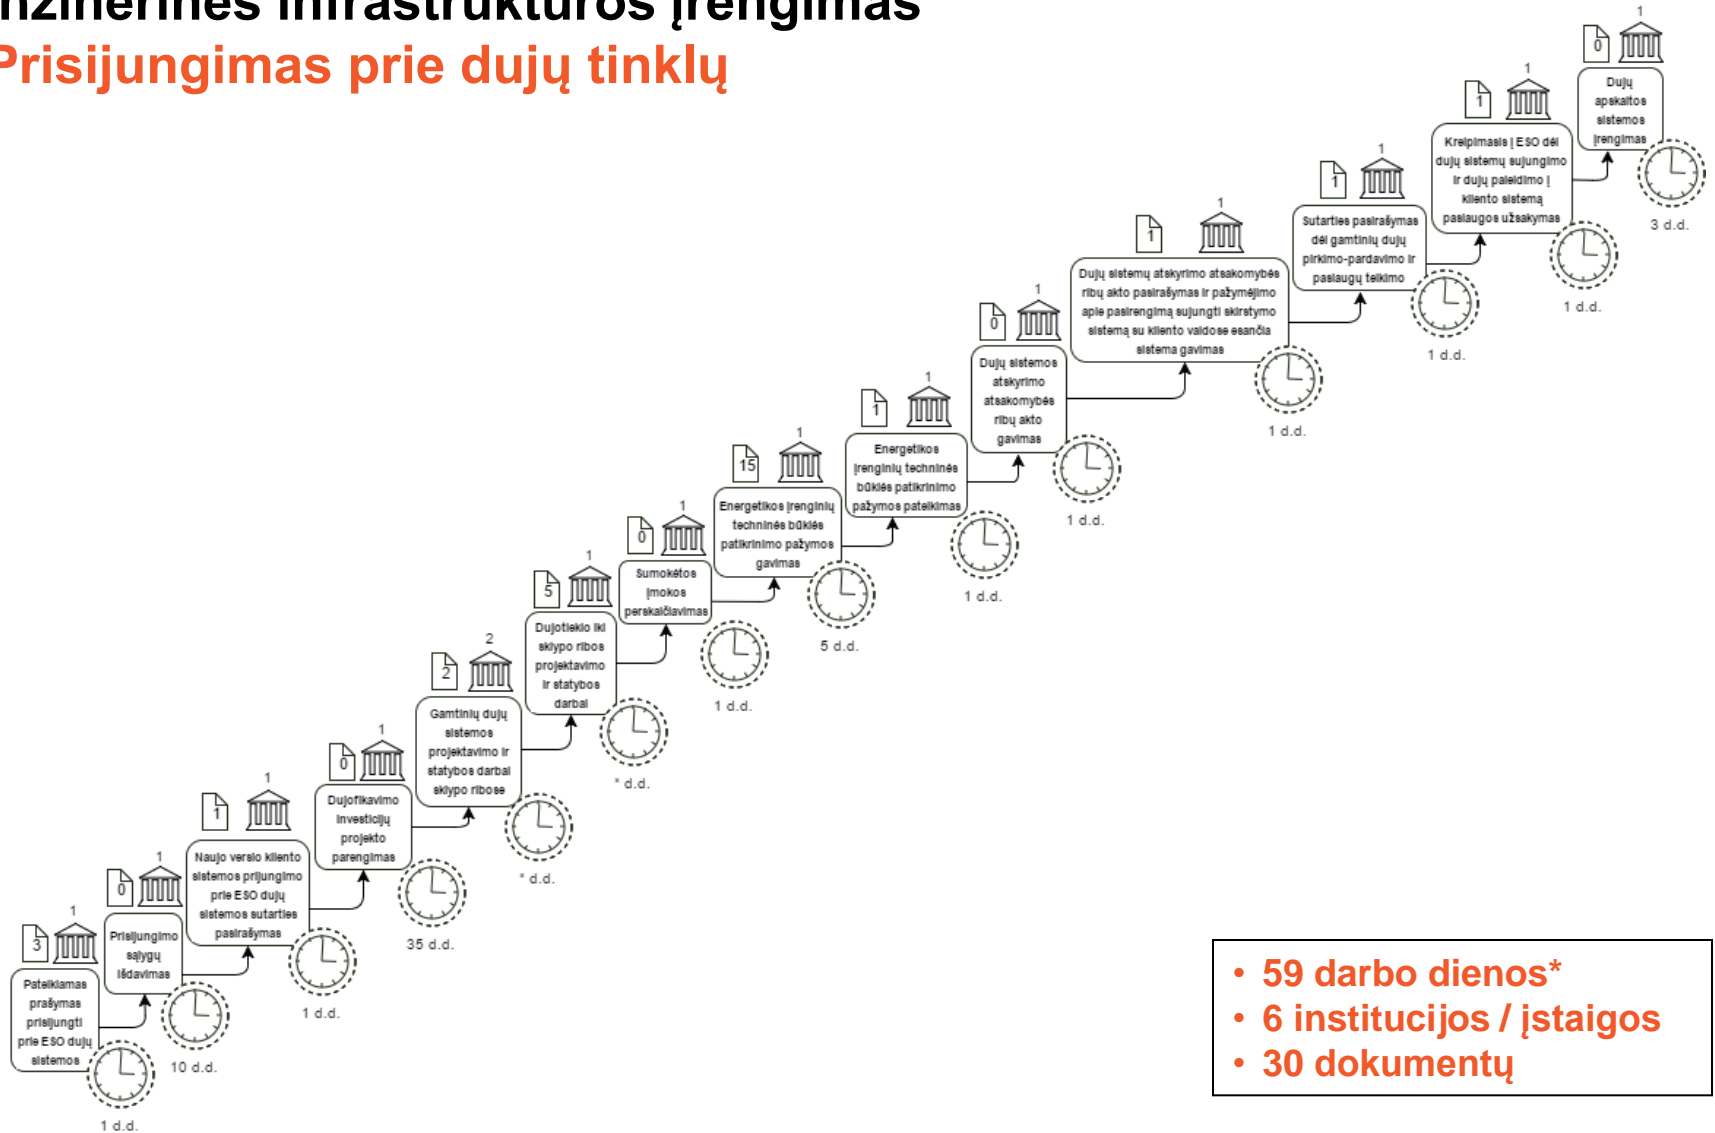

• 59 darbo dienos*
• 6 institucijos / įstaigos
• 30 dokumentų

* Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami projektavimo ir statybos darbai

8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas

Bendra situacija

Procesas	Trukmė (d. d.)	Institucijų ir įstaigų skaičius	Dokumentų skaičius
1. Prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (didelės apimtys)	72-92	4	42
2. Prisijungimas prie vietinės reikšmės kelio infrastruktūros	40	4	11
3. Prisijungimas prie elektros skirstymo tinklų	40	5	20
4. Prisijungimas prie dujų tinklų	59	6	30
Iš viso:	72-92	19	103




9

Taršos leidimų išdavimas



9. Taršos leidimų išdavimas

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas

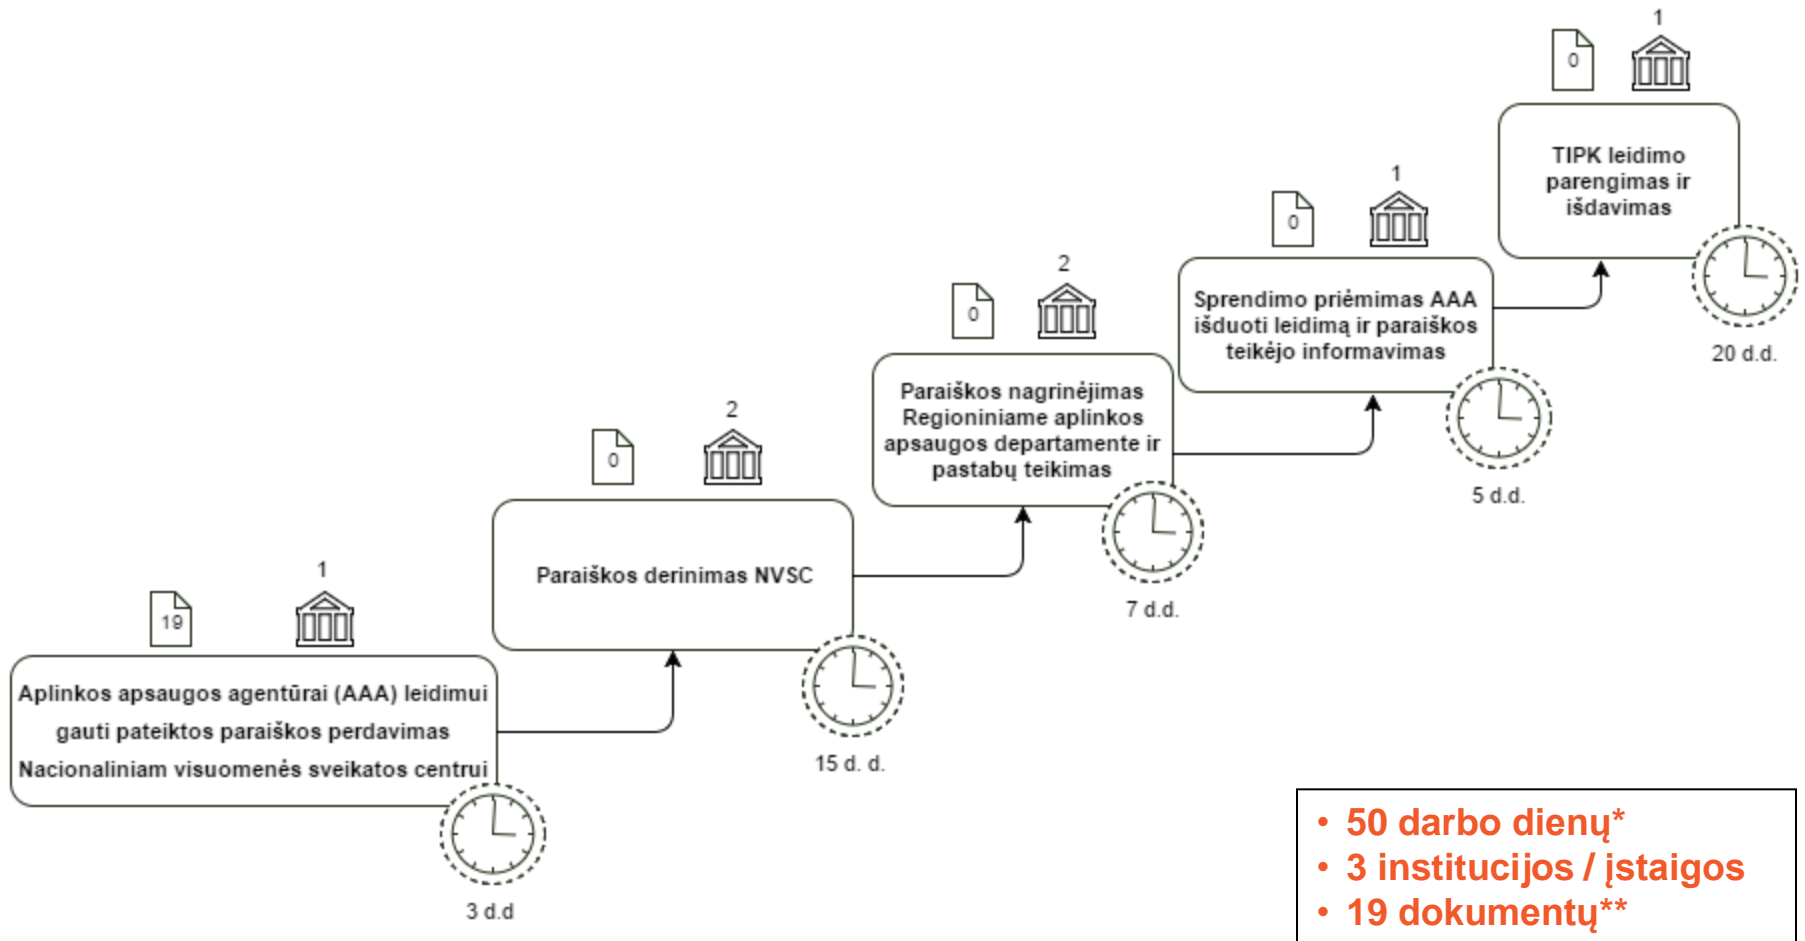

* Į licencijos išdavimo laiką neįtrauktas laikas paskelbti apie išduotą licenciją „Valstybės žiniuose“

** Vertinamas idealus variantas, kuomet nereikalaujama papildyti informacijos paraiškoje, ar pateikti papildomų dokumentų




10

Darbu saugos leidimų išdavimas



10. Darbų saugos leidimų išdavimas

1.1. Darbuotojų sauga ir sveikata

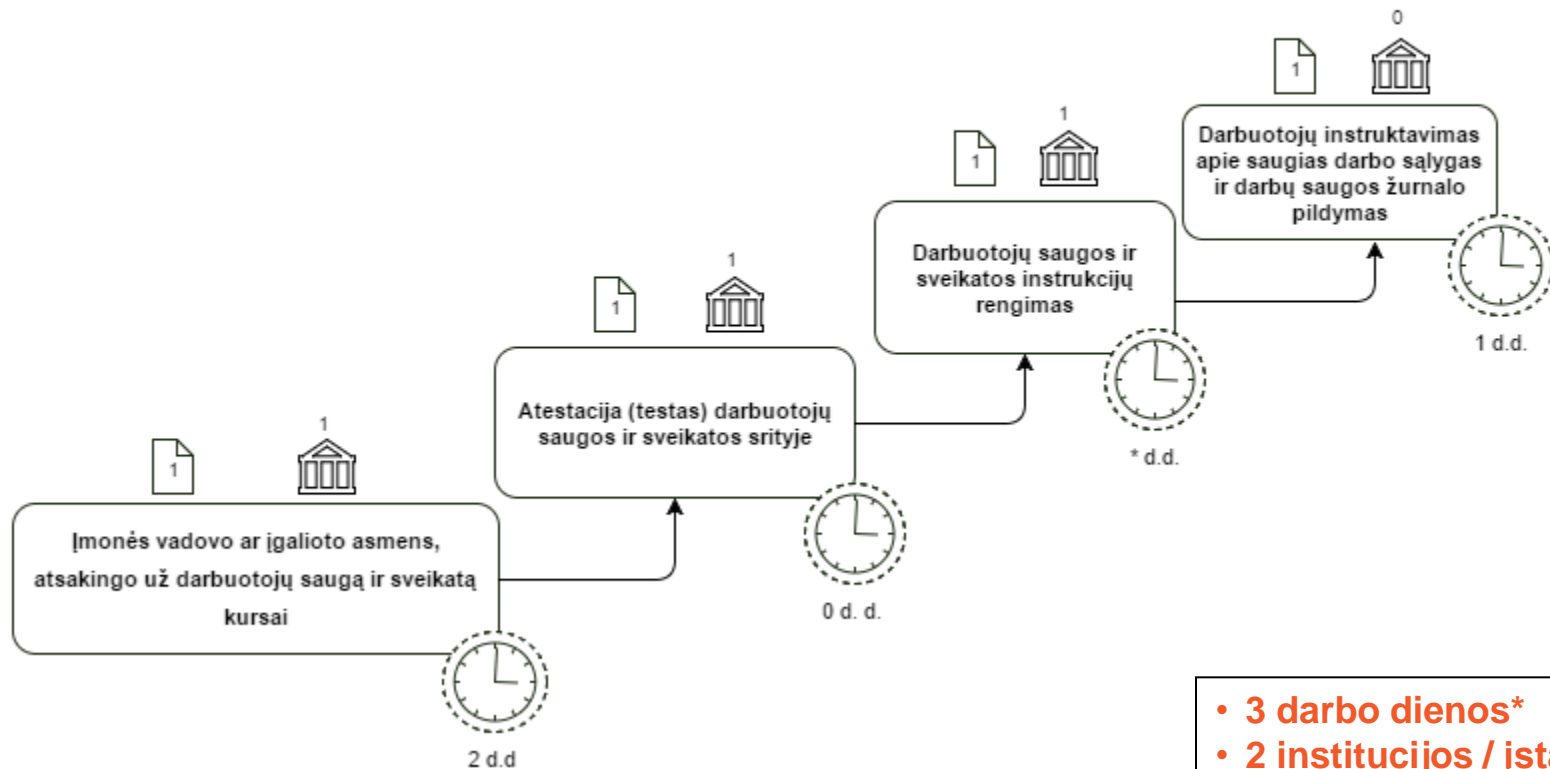


- 3 darbo dienos*
- 2 institucijos / įstaigos
- 4 dokumentai

* Neįtraukiamas laikas, per kurį darbų saugos įmonė parengia darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, priklausomai nuo įmonės veiklos



10. Darbų saugos leidimų išdavimas

1.2. Darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimas

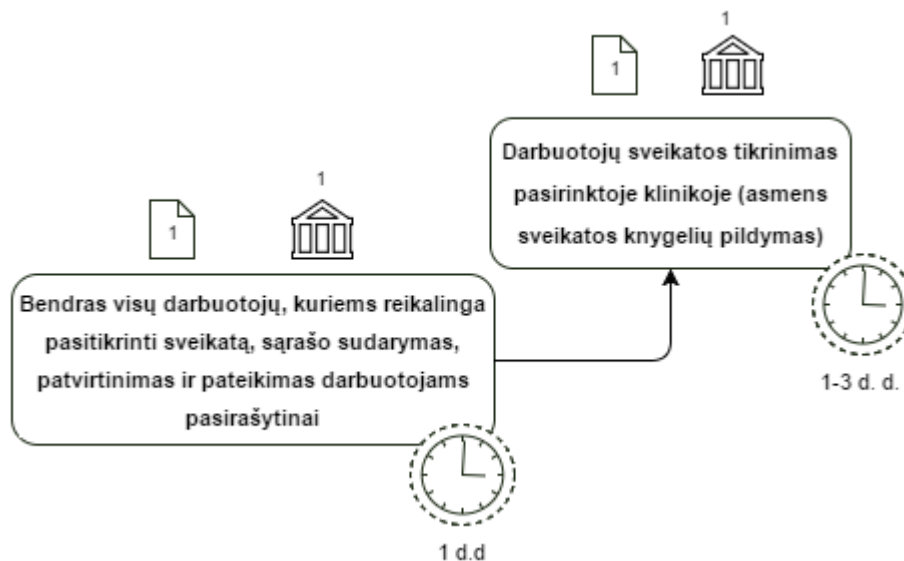


- 2 - 4 darbo dienos*
- 1 institucija / įstaiga
- 2 dokumentai

* Neįtraukiamas laikas, per kurį darbų saugos įmonė parengia darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, priklausomai nuo įmonės veiklos



10. Darbų saugos leidimų išdavimas

2. Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais

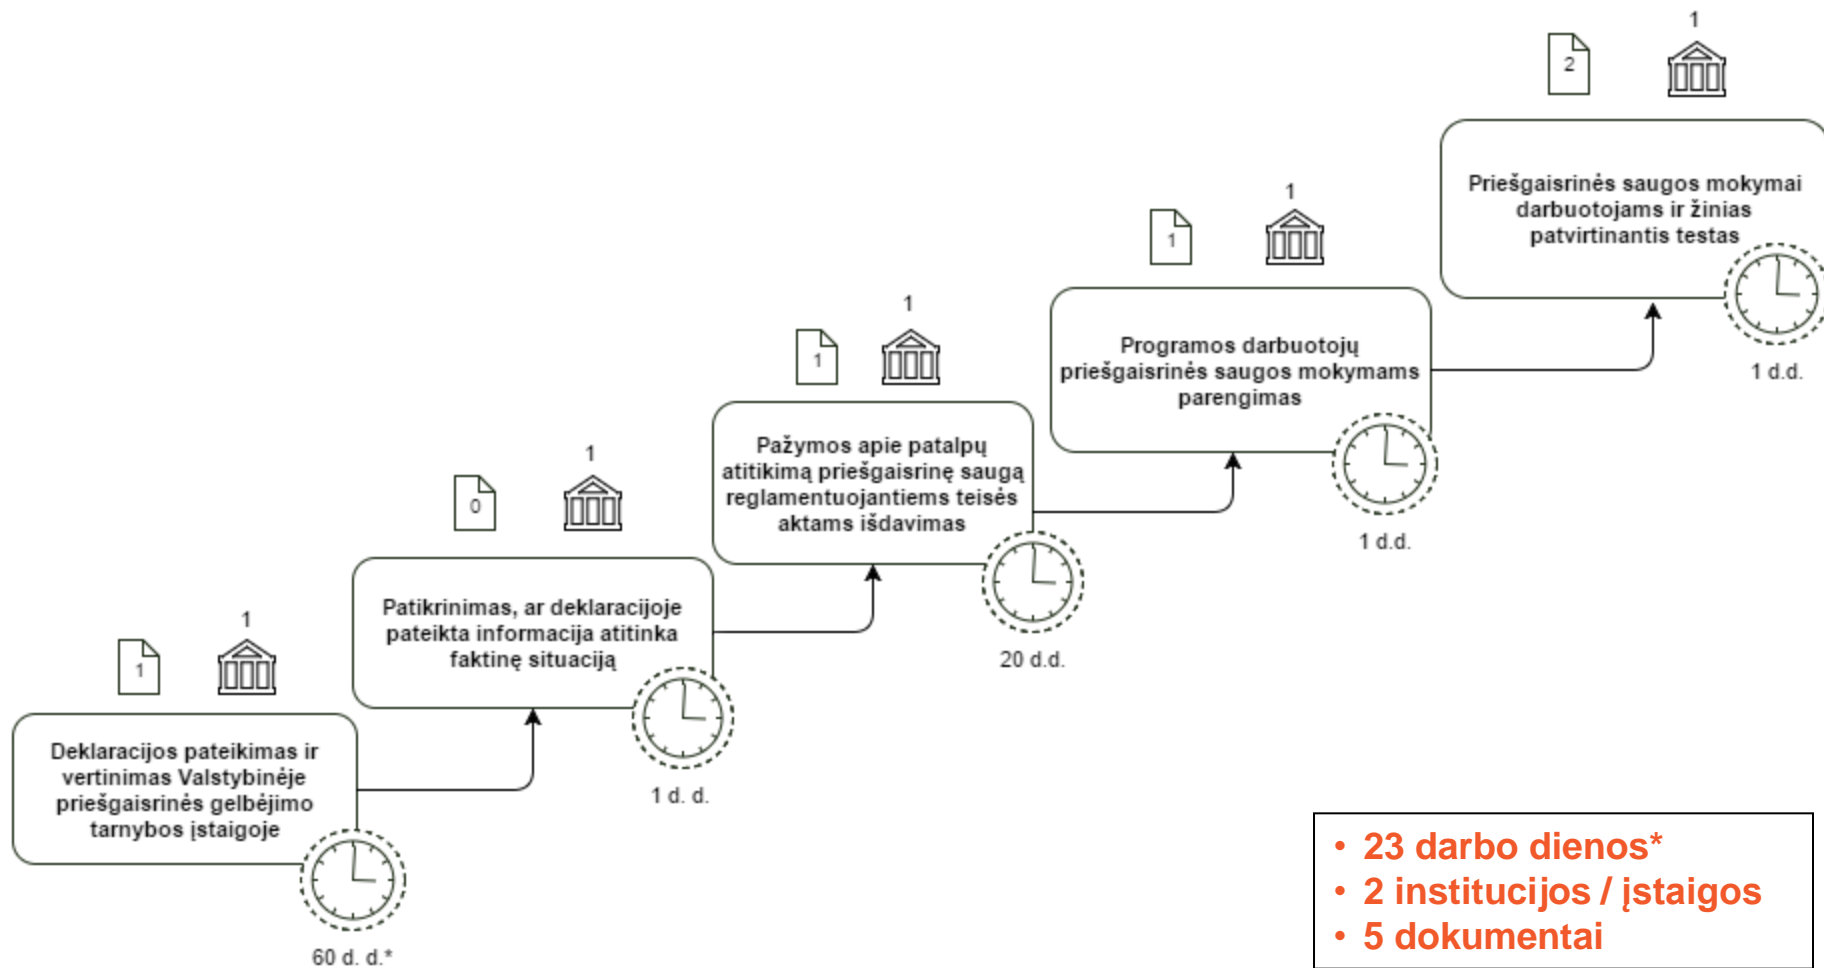

* Neįtraukiamas laikas, jeigu priešgaisrinės saugos darbų programa yra ne standartinė, o ruošiama priklausomai nuo vykdomos veiklos



10. Darbų saugos leidimų išdavimas

Bendra situacija

Procesas	Trukmė (d. d.)	Institucijų ir įstaigų skaičius	Dokumentų skaičius
1.1. Darbuotojų sauga ir sveikata	3	2	4
1.2. Darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimas	2-4	1	2
2. Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais	23	2	5
Iš viso:	23	5	11



11

Gamybos veiklai reikalingų licencijų išdavimas



11. Gamybos veiklai reikalingų licencijų išdavimas

- Licencijų išdavimo procesas analizuojamas **III gairės 2 dalyje**






12

Atliekų tvarkymo sutarčių pasirašymas, atliekų
ženklinimas, deklaravimas ir apskaita



12. Atliekų tvarkymo sutarčių pasirašymas, atliekų ženklavimas, deklaravimas ir apskaita

Sutarčių pasirašymas ir atliekų ženklavimas

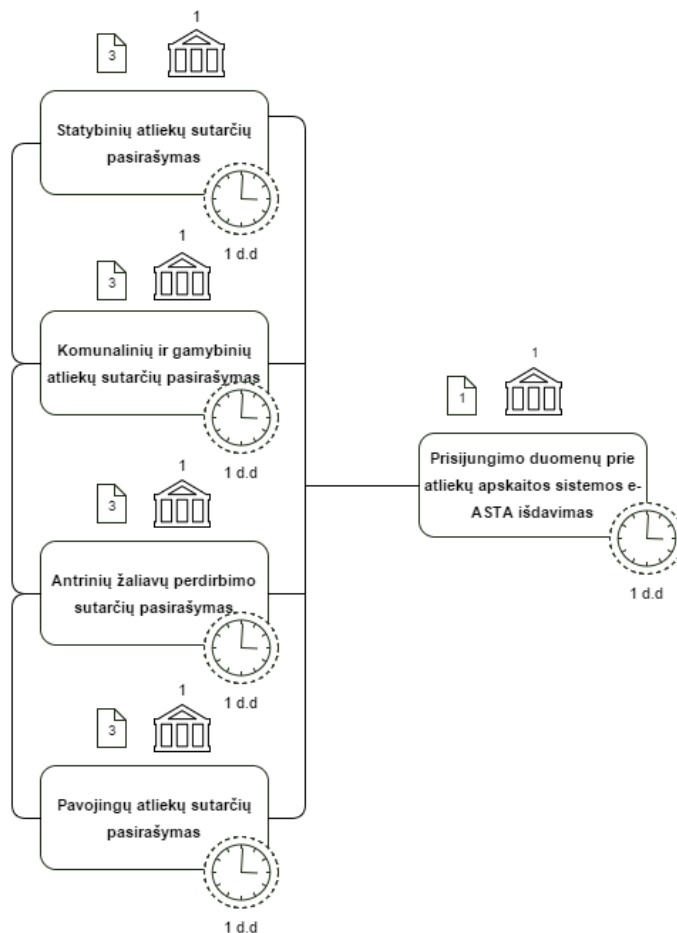

- 1 darbo diena
- 4 institucijos / įstaigos
- 10 dokumentų



13

Atvejo analizē



Atvejo analizė

Gamybinis projektas

Procesas	Trukmė (d. d.)	Institucijų ir įstaigų skaičius	Dokumentų skaičius
1. UAB steigimas	9-13	5	7
2.2.1. Perkamas privatus kitos paskirties žemės sklypas	14-16	3	3
3. Atliekamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas	65	15	4
4.2.1. Saugotinių želdinių kirtimas	30	1	3
5.3. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas	56*	11	11
6.1. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV)	115	6	8
6.2. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)	271	5	12
6.3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)	94	3	11
7. Statybos proceso organizavimas – ypatingos svarbos statinys	51-57**	6	46
8.1. Prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (didelės apimties)	72-92****	4	42
8.2. Prisijungimas prie vietinės reikšmės kelio infrastruktūros	40	4	11
8.3. Prisijungimas prie elektros skirstymo tinklų	40	5	20
8.4. Prisijungimas prie dujų tinklų	59	6	30
9. TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimas	50	3	19
10.1.1 Darbuotojų sauga ir sveikata	3	2	4
10.1.2. Darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimas	2-4	1	2
10.2. Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais	23	2	5
12. Atliekų tvarkymo sutarčių pasirašymas, atliekų ženklavimas, deklaravimas ir apskaita	1	4	10
Iš viso:	491-517	86 (18)***	249 (225)

* Detaliojo plano parengiamajame etape priimamas sprendimas atlikti PAV (iš bendros sumos išskaičiuojamos 46 d. d.)

** Vertinamas bendras laikas, kuomet yra parengtas detalus planas

*** Unikalioms institucijoms ir įstaigoms



Atvejo analizė

Unikalios institucijos ir įstaigos

Unikalios institucijos ir įstaigos	
Aplinkos apsaugos agentūra	Valstybinė energetikos inspekcija
Kultūros paveldo departamentas	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Lietuvos geologijos tarnyba	Valstybinė miškų tarnyba
Nacionalinė žemės tarnyba	Valstybinė mokesčių inspekcija
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas	Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Regioninis aplinkos apsaugos departamentas	VĮ „Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras“
Savivaldybės	VĮ „Registų centras“
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Sodra)	VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“



Ačiū!

